

PO FESR BASILICATA 2014-2020

STATO DI AVANZAMENTO DEL PO, PROSPETTIVE N+3 AL 31 DICEMBRE 2020 PREVISIONI DI SPESA PER IL 2021 E INIZIATIVE POSTE IN ESSERE PER IL CONTRASTO AL COVID-19

**Informativa - Punti 3) e 4) OdG del Comitato di Sorveglianza
del 15 dicembre 2020**

SOMMARIO

FINALITA' E STRUTTURA DELL'INFORMATIVA	2
1. IL CONTESTO ECONOMICO LUCANO NELLA CRISI DA COVID 19	3
2. MODIFICA DEL PROGRAMMA OPERATIVO A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19	4
3. STATO DI ATTUAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA E PREVISIONI DI SPESA.....	6
4. STATO DI ATTUAZIONE PER ASSI.....	11
4.1 ASSE 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	11
4.2 ASSE 2 - AGENDA DIGITALE	14
4.3 ASSE 3 – COMPETITIVITÀ.....	16
4.4 ASSE 4 - ENERGIA E MOBILITÀ URBANA	19
4.5 ASSE 5 - TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE.....	21
4.6 ASSE 6 - SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE	24
4.7 ASSE 7 - INCLUSIONE SOCIALE	26
4.8 ASSE 8 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE	29
5. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI (ITI).....	30
5.1 STATO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE	30
5.1.1 AREA INTERNA MONTAGNA MATERANA.....	30
5.1.2 AREA INTERNA MERCURE ALTO SINNI VAL SARMENTO	31
5.1.3 AREA INTERNA ALTO BRADANO	32
5.1.4 AREA INTERNA MARMO PLATANO	32
5.2 STATO DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO	33
5.2.1 ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI POTENZA	33
5.2.2 ITI SVILUPPO URBANO CITTÀ DI MATERA.....	34
6. STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI	35

FINALITA' E STRUTTURA DELL'INFORMATIVA

La presente informativa sullo stato di attuazione al 5 dicembre 2020 affronta e sviluppa i seguenti temi:


- a) Stato di attuazione del programma operativo FESR Basilicata 2014-2020;
- b) Obiettivi di spesa al 31 dicembre 2020 e previsioni di spesa 2021;
- c) Principali iniziative avviate a livello di Asse e di Obiettivi Specifici in termini di procedure selettive (Avvisi/Bandi, manifestazioni di interesse o procedure negoziali), di spesa e di valorizzazione degli indicatori di realizzazione.
- d) Attuazione degli ITI Sviluppo Urbano ed Aree interne.
- e) Attuazione delle azioni interregionali e transnazionali - art. 96.3.d del regolamento 1303/2013. Tali azioni sono descritte nel paragrafo 3 della presente Relazione.

Nell'allegato 1 sono riportati i principali indicatori di output per ciascun Asse del Programma con i dati aggiornati al 5 dicembre 2020, fermo restando che la valorizzazione degli stessi è tuttora in corso.

1. IL CONTESTO ECONOMICO LUCANO NELLA CRISI DA COVID 19

Il Rapporto di aggiornamento congiunturale sull'economia regionale di Banca d'Italia del novembre 2020 evidenzia che le ricadute economiche della pandemia da COVID 19 hanno interessato tutti comparti produttivi della Basilicata.


Il settore industriale lucano, che già era risultato in contrazione durante lo scorso anno, ha risentito in misura rilevante della pandemia. In generale, si è assistito ad un calo del fatturato delle imprese industriali. Il rapporto Banca d'Italia informa che, sulla base di un sondaggio di imprese industriali con almeno 20 addetti, poco meno dei due terzi ha registrato un calo del fatturato nei primi nove mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; per poco meno di un terzo la riduzione è stata maggiore del 15 per cento. Il saldo tra la quota di imprese con fatturato in crescita e quelle in calo è risultato negativo di circa 50 punti percentuali (figura 1). Prevalgono inoltre le imprese che hanno registrato un calo delle ore lavorate: il relativo saldo è stato negativo per oltre 60 punti.

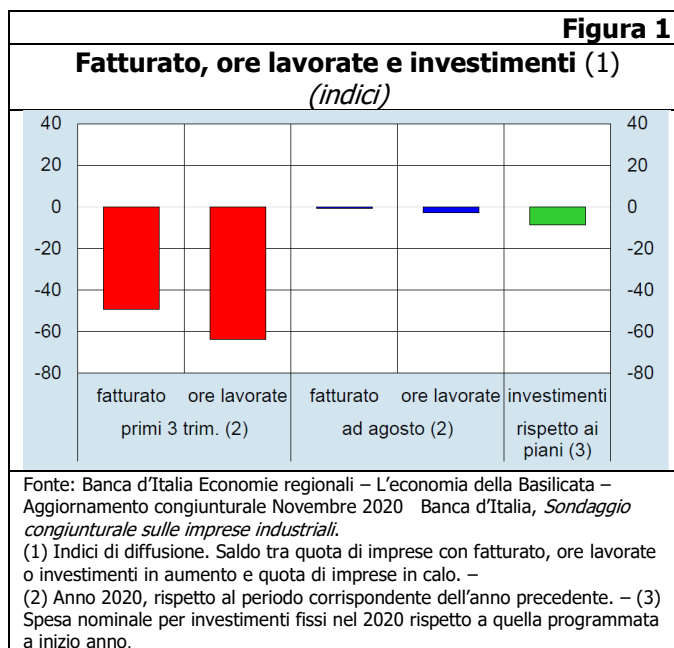

Il Rapporto di banca d'Italia informa anche che nei primi nove mesi del 2020 sulla base dei pagamenti effettuati dalle Amministrazioni locali lucane, dopo la crescita dell'anno 2019. Rispetto alla redditività delle imprese industriali e dei servizi lucane con almeno 20 addetti, il Rapporto informa che si prevede un marcato peggioramento rispetto all'anno precedente. Il saldo tra la quota di imprese che prevedono di chiudere l'esercizio corrente in utile e di quelle che si attendono una perdita si è ridotto di il 9% rispetto al 2019.

Il settore turistico, tra i più colpiti dal blocco delle attività, ha registrato un dimezzamento delle presenze turistiche presso le strutture ricettive nei primi otto mesi del 2020. L'andamento della flessione è rappresentato nella figura 2.

nel comparto delle opere pubbliche si è assistito ad una nei primi nove mesi del 2020 sulla base dei pagamenti

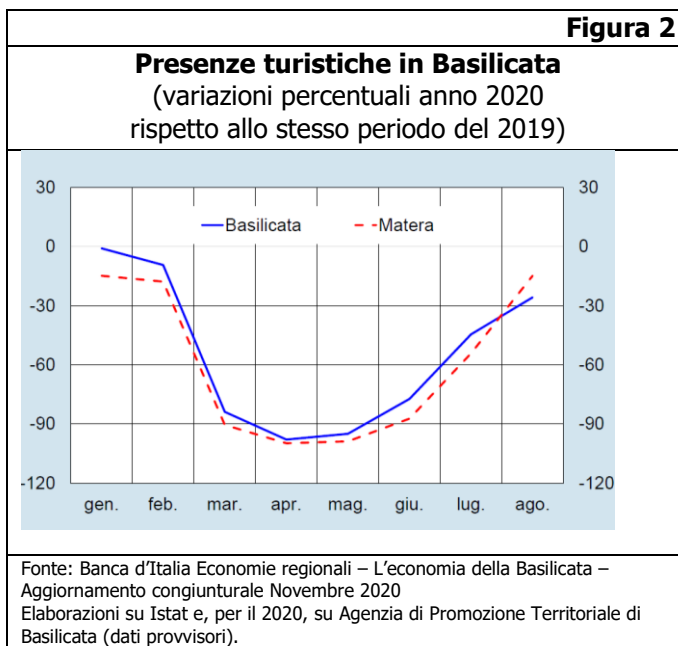

Il credito alle imprese ha accelerato rispetto alla fine dello scorso anno, a seguito della dinamica registrata durante i mesi estivi dai prestiti alle imprese.

I finanziamenti al settore produttivo sono stati sostenuti dalle misure straordinarie pubbliche poste in essere per far fronte, in particolare, all'accresciuta necessità di liquidità derivante dal blocco o riduzione delle attività. L'andamento dei finanziamenti alle imprese è stato tuttavia eterogeneo con riferimento alle branche di attività: il credito è aumentato nel terziario e nelle costruzioni, mentre sono calati i prestiti al settore manifatturiero.

In generale, come emerge da più fonti ufficiali, le regioni del Sud non hanno ancora raggiunto i livelli di reddito e di occupazione presenti prima della crisi del 2008, mentre le stime per la ripresa post 2020 confermano una ripresa molto più debole delle regioni meridionali in termini di reddito, consumi e investimenti rispetto a quelle del centro Nord.

2. MODIFICA DEL PROGRAMMA OPERATIVO A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19

Con **Decisione C(2020) 1682 final del 12 marzo 2020** la Commissione Europea ha approvato il **PO FESR Basilicata 2014-2020 nella versione integrata 5.0**, approvata dal Comitato di Sorveglianza del 12 dicembre 2019. La proposta di modifica è stata determinata soprattutto dall'esigenza di dover riallocare la riserva di performance degli Assi 4 (Ot4) e 7 (OT9).

A seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19 si è reso necessario proporre un'ulteriore modifica al PO FESR Basilicata 2014-2020. Tale modifica è stata elaborata:

- nel rispetto delle disposizioni che la Commissione Europea ha introdotto, nell'ambito del pacchetto di iniziative **CRII e CRII+ (Iniziative d'Investimento in risposta al Coronavirus)**, con l'entrata in vigore del **Regolamento (UE) n. 2020/460** e del **Regolamento (UE) n. 2020/558** del Parlamento europeo e del Consiglio, che hanno modificato i regolamenti dei fondi strutturali in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia¹

- in linea con **l'articolo 126, comma 10 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27)** che ha previsto che le Amministrazioni titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali destinino le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

La proposta di modifica ha tenuto conto, altresì, anche della **Comunicazione COM (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**².

Per il dettaglio sulle procedure/operazioni ammesse a finanziamento in contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale da Covid 19 si rimanda ai paragrafi successivi inerenti l'attuazione dei singoli Assi del Programma.

Le proposte di modifica del POR FESR 2014/2020 sono state oggetto di condivisione nella riunione con i rappresentanti del Partenariato in seno al Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2020 e sono state approvate con le procedure di consultazione scritta concluse rispettivamente in data 16 luglio 2020 e 25 luglio 2020.³

La proposta di modifica del POR è stata approvata dalla Commissione con **Decisione C(2020) 5747 final – 20 agosto 2020 (Versione 6.0)**, la cui presa d'atto è avvenuta con la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020.

¹ In particolare, l'entrata in vigore dei citati Regolamenti ha favorito ulteriormente l'utilizzo dei fondi in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale, consentendo: la temporanea possibilità di innalzare il tasso di cofinanziamento UE al 100% per l'anno contabile 2020-2021; l'ampliamento della possibilità di trasferimento di risorse tra i Fondi e programmi per l'annualità di impegno 2020; l'eliminazione degli obblighi di concentrazione tematica; misure di semplificazione con riferimento alla valutazione ex ante degli strumenti finanziari e sui controlli; piena coerenza con le misure del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (temporary framework), in particolare con riferimento alle imprese in difficoltà.

² Si vedano al riguardo anche le disposizioni sul regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (decreto rilancio).

³ Per i dettagli si rinvia la documento illustrativo delle modifiche del PO trasmesso al Comitato di Sorveglianza con nota dell'Autorità di Gestione n. 137537/12AF del 16 luglio 2020 e n. 145803/12AF del 25 luglio 2020.

Contestualmente a quest'ultima riprogrammazione del POR FESR si è provveduto a definire una proposta di riprogrammazione del Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Basilicata 2014/2020 approvato con Delibera CIPE n. 71/2018.

La necessità di modificare ulteriormente il POC, nel quadro generale di emergenza per il diffondersi della pandemia da COVID19, è legata anche **all'Accordo sottoscritto in data 6 agosto 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e la Regione Basilicata, inerente la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020**, al fine di utilizzare i fondi strutturali europei (FESR e FSE) come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell'immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l'emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese.

In particolare, al fine di poter attivare in ambito POR le risorse per le finalità connesse all'emergenza COVID-19, si è provveduto a imputare il costo di alcuni progetti e procedure sul programma complementare POC Basilicata, così da salvaguardare alcune procedure attivate sul P.O. FESR provvedendo contestualmente a "liberare" sul Programma FESR risorse da dedicare nell'immediato a misure legate all'emergenza pandemica. Si precisa che tutte le procedure selettive (Avvisi, bandi, procedure negoziali/Accordi di programma) attivate sui 9 assi del POR FESR alla data della riprogrammazione (luglio 2020) sono state "salvaguardate" a valere sul POR FESR 2014/2020 o sul POC Basilicata 2014/2020.

La valutazione sulle modalità di salvaguardia delle operazioni POR sul POC è stata effettuata tenendo conto che il **comma 7, art. 242 del Decreto n. 34/2020 ha spostato la data ultima di ammissibilità delle spese sul POC al 31/12/2025**, ben oltre vigente scadenza del 31.12.2023 stabilita dall'articolo 65 del Reg. UE n. 1303/2013.

La proposta di modifica al POC è stata oggetto di condivisione partenariale con il Dipartimento Politiche di Coesione (DPCOE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'istruttoria si è conclusa con la nota DPCOE-0003823-P- del 13/10/2020, con la quale il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha comunicato alla Regione Basilicata di condividere le modifiche proposte⁴.

Alla luce della citata condivisione, con D.G.R. n. 732 del **26 ottobre 2020** è stato approvato il **POC Basilicata 2014/2020 Versione 3.0 ed il relativo Piano finanziario per Asse ed Azione**.

Inoltre, con nota del Presidente prot. n. 129968/11A1 del 7 luglio 2020 è stata avviata la procedura di consultazione scritta per esaminare e approvare le modifiche ed integrazioni al documento "Criteri di Selezione delle operazioni" al fine di approvare una misura straordinaria di sostegno alle famiglie lucane a valere sull'Azione 10.10.8.1 dell'Asse 8 "Potenziamento del sistema di istruzione" del PO FESR Basilicata 2014-2020.

A conclusione della procedura di consultazione scritta, con nota prot. n. 137537/12AF del 16 luglio 2020 è stato approvato il documento **"Criteri di selezione delle operazioni" del PO FESR Basilicata 2014-2020 nella Versione 15.0**.

Infine, con nota del Presidente prot. n. 211267/11A1 del 9 novembre 2020 è stata avviata la procedura di consultazione scritta per esaminare e approvare le modifiche ed integrazioni al documento "Criteri di Selezione delle operazioni" in coerenza con le modifiche apportate al PO FESR Basilicata 2014-2020.

A conclusione della procedura di consultazione scritta, con nota prot. n. 218549/12AF del 17 novembre 2020 è stato approvato il documento **"Criteri di selezione delle operazioni" del PO FESR Basilicata 2014-2020 nella Versione 16.0**.

⁴ La rimodulazione del POC, nella versione approvata con Delibera CIPE n. 71/2018, infatti, non ha comportato variazioni degli obiettivi strategici e della dotazione finanziaria complessiva del Programma, di conseguenza la relativa modifica, ai sensi della Delibera CIPE n. 10/2015, non è stata oggetto di approvazione da parte del CIPE, ma di condivisione tra l'Amministrazione titolare del Programma e il DPCOE.

3. STATO DI ATTUAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA E PREVISIONI DI SPESA

Il POR FESR Basilicata 2014/2020 ha una dotazione di 550,688 milioni di euro⁵ ed è articolato in 9 Assi prioritari.

I target di spesa da perseguire sono quelli comunitari al 31 dicembre di ciascun anno stabiliti in base alla cosiddetta regola N+3 (disimpegno automatico) del Regolamento UE n. 1303/2013. Come è noto i target di spesa sono stati rispettati sia al 31 dicembre 2018 che al 31 dicembre 2019.

L'obiettivo di spesa pubblica cumulata al 31 dicembre 2020 è pari a 202,866 milioni di euro (di cui 152,149 milioni euro a titolo UE e 50,717 a titolo di cofinanziamento nazionale). Tale obiettivo è stato già raggiunto in quanto la **spesa certificata al 26 novembre 2020 ammonta a 258,950 milioni di euro**, facendo registrare un incremento di oltre 60 milioni di euro rispetto a quanto certificato a dicembre 2019.

L'obiettivo di spesa pubblica cumulata al 31 dicembre 2021 è pari a 261,717 milioni di euro (di cui 196,287 milioni euro a titolo UE e 65,430 a titolo di cofinanziamento nazionale). E' possibile evidenziare che tale obiettivo, in base ai dati della certificazione attuale, è stato quasi raggiunto.

Nella tabella 1 in calce viene rappresentato lo stato di attuazione finanziaria al 10 dicembre 2020 del Programma a livello di asse con riferimento ai principali aggregati:

- Numero dei progetti selezionati/ammessi a finanziamento;
- Pagamenti sostenuti e rendicontati dai beneficiari (spesa rendicontata);
- Pagamenti sostenuti, rendicontati dai beneficiari e certificati dall'Autorità di Certificazione (Spesa certificata).

Sono state attivate **233 procedure selettive** (Bandi, Avvisi, Manifestazioni di interesse ed Accordi di programma/Procedure negoziali). Nell'ambito di tali procedure sono stati selezionati ed ammessi a finanziamento **17.319 progetti** per un costo ammesso di circa 615,135 milioni di euro di cui:

- **16.512 progetti rientranti nella categoria degli aiuti**⁶;
- **807 progetti rientranti nella categorie degli appalti di lavori e/o di forniture.**

I pagamenti rendicontati dai beneficiari al 10 dicembre 2020 ammontano a **288,747 milioni di euro**, pari al **52%** circa della dotazione (cfr. Tab. 1).

L'avanzamento si spesa nel corso del 2020 è stato assicurato da una costante azione di supporto e confronto con i beneficiari da parte delle strutture regionali, anche nel corso della emergenza da COVID 19. In tale fase è stata, da un lato, assicurata la ordinaria attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione; dall'altro, attivate alcune misure connesse all'emergenza. In particolare, a marzo 2020, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 e di ripristino delle normali condizioni di operatività per i soggetti beneficiari/attuatori, sono stati sospesi i termini di scadenza ordinatori o perentori relativi all'avvio e/o alla conclusione di numerosi progetti a regia regionale, rientranti nella tipologia di appalti pubblici di lavori e forniture, ivi compresi gli aiuti di interesse economico generale (SIEG) erogati ad organismi che realizzano opere/infrastrutture di pubblica utilità, finanziati a valere sulle procedure selettive del POR FESR Basilicata 2014/2020 e del POC Basilicata

⁵ Come è noto, a seguito della modifica del POR FESR 2014/2020 a fine 2018 la dotazione finanziaria complessiva originaria di 826,031 milioni di euro è stata così declinata:

- a) 550,688 milioni di euro nell'ambito del POR FESR 2014/2020, di cui alla Decisione della Commissione europea n. 9114 del 19 dicembre 2018. La modifica del POR ha comportato un incremento del tasso di cofinanziamento UE dal 50 al 75%;
- b) 275,344 milioni di euro nell'ambito del POC Basilicata 2014/2020, di cui alla Delibera CIPE n. 71/2018.

⁶ Gli aiuti includono, oltre alle agevolazioni alle PMI, anche quelli erogati ad organismi che realizzano opere/infrastrutture di pubblica utilità: le agevolazioni alle imprese ed aiuti di interesse economico generale SIEG per i progetti relativi alla Edilizia residenziale; gli aiuti in esenzione per le Smart Grids e gli aiuti per la Banda Ultra larga.

2014/2020 (cfr. D.G.R. n. 204 del 27 marzo 2020). Tale deliberazione ha anche stabilito che le Amministrazioni e gli Enti attuatori/beneficiari dei progetti in questione adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione delle attività e dei procedimenti connessi alle operazioni, con particolare riferimento alle attività (tecniche, amministrative e finanziarie) che è possibile svolgere anche grazie al ricorso a forme di lavoro agile (smart working).

Tabella 1 – Stato di avanzamento del POR FESR Basilicata 2014/2020 al 10 dicembre 2020 e previsioni di spesa (dati in milioni di euro)

ASSE	DOTAZIONE ATTUALE POR (Decisione 2020)	N° PROCEDURE ATTIVATE	N° PROGETTI SELEZIONATI	SPESA CERTIFICATA AL 31.12.2019	SPESA CERTIFICATA AL 26.11.2020	SPESA RENDICONTATA DAI BENEFICIARI AL 10.12.2020	%	PREVISIONE DI SPESA CERTIFICABILE AL 31.12.2020	PREVISIONE DI SPESA CERTIFICABILE AL 30.06.2021	PREVISIONE DI SPESA CERTIFICABILE AL 31.12.2021	
	a	b	c	d	e	f	g=f/a				
1	RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	61,588	13	184	7,964	9,926	10,970	17,81%	10,970	10,999	14,594
2	AGENDA DIGITALE	25,458	13	141	16,483	18,242	18,770	73,73%	18,770	25,458	25,458
3	COMPETITIVITÀ	189,772	32	16.032	61,441	92,797	104,522	55,08%	95,000	103,697	112,847
4	ENERGIA E MOBILITÀ URBANA	66,750	20	273	22,322	27,626	28,934	43,35%	28,000	49,501	59,055
5	TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE	73,761	47	309	24,730	29,585	37,761	51,19%	29,585	46,407	73,761
6	SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE	49,206	10	79	26,401	33,698	35,169	71,47%	35,169	37,525	45,179
7	INCLUSIONE SOCIALE	40,116	43	162	13,920	15,370	16,100	40,13%	16,100	28,959	40,116
8	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE	22,015	20	105	11,128	15,001	18,660	84,76%	15,001	20,409	22,459
9	ASSISTENZA TECNICA	22,021	35	34	14,407	16,706	17,860	81,11%	17,860	19,231	22,811
TOTALE		550,688	233	17.319	198,795	258,950	288,747	52,43%	266,456	342,185	416,280

Fonte: Sistema informativo di monitoraggio regionale SIFESR

Nella tabella 2a si riporta un dettaglio delle domande di pagamento trasmesse ad oggi alla Commissione Europea; mentre nella tabella 2b i rimborsi ricevuti a titolo di quota UE e di quota stato da per il tramite del Ministero dell'Economie e delle Finanze (IGRUE):

Tabella 2a – Domande di Pagamento

Periodo Contabile	Tipo	Versione	Spesa pubblica totale dichiarata (euro)
01/07/2020 - 30/06/2021	Intermedio	1.0	60.155.680,69
01/07/2019 - 30/06/2020	Finale	2.0	43.180.142,32
	Intermedio	1.0	43.180.142,32
01/07/2018 - 30/06/2019	Conti annuali		- 1.470.681,03
	Finale	5.0	151.900.248,12
	Intermedio	4.0	151.900.248,12
	Intermedio	3.0	129.005.427,23
	Intermedio	2.0	126.104.158,83
	Intermedio	1.0	35.514.296,29
01/07/2016 - 30/06/2017	Conti annuali		- 639.624,40
	Finale	1.0	5.834.937,57

Tabella 2b – Rimborsi comunitari e nazionali (periodo 2015-2020)

DATA	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA STATO (Fondo rotativo)	IMPORTO
17/09/2015		quota nazionale prefinanziamento iniziale 2014+2015	5,435
17/09/2015	quota UE prefinanziamento iniziale 2014+2015		7,765
15/02/2016		quota nazionale prefinanziamento iniziale 2016	2,718
15/02/2016	quota UE prefinanziamento iniziale 2016		3,882
17/02/2016		quota nazionale prefinanziamento annuale 2016	5,435
17/02/2016	quota UE prefinanziamento annuale 2016		7,765
28/06/2017		quota nazionale prefinanziamento 2017 FESR	1,699
28/06/2017	quota comunitaria prefinanziamento 2017 FESR		2,427
07/09/2017		quota stato domanda pagamento 1/2017 FESR	1,838
08/09/2017	quota comunitaria domanda pagamento 1/2017 FESR		2,626
05/06/2018	quota comunitaria prefinanziamento 2018 FESR		0,457
20/07/2018		quota stato prefinanziamento 2018 FESR	0,320
13/02/2019	quota comunitaria DOMANDA PAGAMENTO 1/2018		15,981
13/02/2019		quota stato DOMANDA PAGAMENTO 1/2018	11,187
27/02/2019	quota comunitaria DOMANDA PAGAMENTO 2/2018		69,139
27/02/2019		quota stato DOMANDA PAGAMENTO 2/2018	8,674
12/07/2019	quota comunitaria DOMANDA PAGAMENTO 3/2018		1,958

DATA	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA STATO (Fondo rotativo)	IMPORTO
23/07/2019	quota comunitaria DOMANDA PAGAMENTO 4/2018		14,918
13/02/2020		quota stato DOMANDA PAGAMENTO 1/2019	3,584
13/02/2020	quota comunitaria DOMANDA PAGAMENTO 1/2019		13,980
01/04/2020		prefinanziamento annuale 2020 (50%)	2,718
01/04/2020	prefinanziamento annuale 2020 (50%)		5,824
09/04/2020		prefinanziamento annuale 2020 (50%)	2,718
10/04/2020	prefinanziamento annuale 2020 (50%)		5,824
		TOTALE	198,871

E' in corso di rimborso l'importo di 54 Meuro circa a fronte della domanda di pagamento di novembre 2020.

Si prevede di trasmettere una ulteriore domanda di pagamento entro il 31 dicembre 2020 che comporterà una spesa certificata cumulata pari a 266,456 Meuro.

Si stima che la spesa potenzialmente certificabile sarà pari a 355,549 Meuro al 30 giugno 2021 ed a 446,674 Meuro entro il 31 dicembre 2021. Al tempo stesso, tali previsioni includono anche spese relative ad operazioni in overbooking a valere sul programma complementare (POC); pertanto, si è ritenuto di limitarsi a indicare tra le spese certificabili sul POR FESR 2014/2020 i seguenti importi: 342,185 al 30 giugno 2021 e 416,280 al 31 dicembre 2021. Tali previsioni tengono conto della dotazione finanziaria degli Assi. Le previsioni di spesa sono declinate a livello di ciascun asse nella tabella 1.

4. STATO DI ATTUAZIONE PER ASSI

4.1 ASSE 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

L'Asse 1 è finalizzato a sviluppare il sistema della ricerca regionale e le capacità di innovazione delle imprese lucane con riferimento alle aree individuate nella " *Strategia regionale per la Specializzazione Intelligente*" (S3): Aerospazio, Automotive, Bioeconomia, Energia, Industria culturale e creativa.

Gli obiettivi prefissati nell'Asse saranno raggiunti principalmente attraverso interventi di:

- potenziamento delle infrastrutture di ricerca nei settori della S3 quale driver di innovazione per tutto il contesto regionale e fattore strategico di attrattività per ricercatori e imprese;
- sostegno agli investimenti in ricerca ed innovazione delle imprese, sviluppo dei cluster tecnologici e erogazione di servizi specialistici forniti da un intermediario del trasferimento tecnologico.

Sull'Asse 1 (OT1) al 5 dicembre 2020 sono state attivate e selezionate n. 184 operazioni.

E' stato finanziato **l'Avviso per l'erogazione di voucher per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale** il cui fine è di sostenere le imprese che necessitano di acquisire all'esterno servizi altamente qualificati e competenze volte ad incrementare la competitività e l'innovazione in coerenza con le linee strategiche della Smart Specialization regionale (Importo 9 Meuro - D.G.R. n. 707 del 27 luglio 2018). L'apertura dello sportello telematico per la candidatura delle istanze a valere sull'avviso si è articolata in n. 3 finestre, chiuse rispettivamente il 15 dicembre 2018, il 2 aprile 2019 ed il 18 luglio 2019. I progetti già finanziati sull'Avviso sono n. 174 con un costo complessivo ammesso di circa 5 Meuro. Pertanto, l'avviso ha fatto registrare delle economie in parte già riprogrammate a luglio 2020 (1,6 Meuro) ed in parte da riprogrammare (2,3 Meuro).

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,310 Meuro.

E' stato approvato il **Bando per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici** della Regione Basilicata rivolto ai Cluster tecnologici nelle 5 aree previste dalla Strategia S3: Automotive, Aerospazio, Bioeconomia, Energia, Industria culturale e creativa (Importo 14 Meuro - D.G.R. n. 527 del 15 giugno 2018). L'Avviso è stato articolato in due fasi. La prima fase dell'Avviso (fase A) è stata finalizzata alla selezione e al finanziamento dei Piani di Attività per lo sviluppo, animazione e promozione di ciascun cluster (importo totale del contributo richiesto circa 1 Meuro). I Piani sono stati selezionati e sono in fase di attuazione. La seconda fase (fase B) ha previsto la candidatura di Progetti di Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale da parte delle imprese e centri di ricerca aderenti ai Cluster. Sono stati candidati n. 12 progetti che, dopo la valutazione positiva della ricevibilità formale, sono stati sottoposti alla valutazione di merito da parte della Commissione di Valutazione: La valutazione è in corso di conclusione e si stima che la concessione del finanziamento avverrà a gennaio 2021.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,240 Meuro.

E' stato attivato **l'Avviso per la selezione di progetti complessi** (c.d. Bando CORES) nelle aree di specializzazione S3 dell'Energia e della Bioeconomia (Importo 12,2 Meuro - D.G.R. n. 195 del 15 marzo 2019). Alla scadenza dell'Avviso (31 luglio 2019) sono state presentate n. 8 istanze di cui: 6 per l'area di

Specializzazione Energia e 2 per l'area di specializzazione Bioeconomia. La valutazione della ricevibilità formale si è conclusa con i seguenti esiti:

- n. 6 progetti Ricevibili (n.5 per l'Area di Specializzazione Energia e n.1 per l'area di specializzazione Bioeconomia);
- n. 2 Progetti non ammissibili (n. 2 per l'Area di specializzazione Energia e n. 1 per l'area di specializzazione Bioeconomia).

E' in corso la valutazione di merito da parte della Commissione che si completerà entro fine dicembre 2020.

Sono stati approvati due **Avvisi per la realizzazione delle Infrastrutture di Ricerca**.

Un primo avviso è stato rivolto alle due infrastrutture riconosciute come "prioritarie" nel Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR) e gestite dal Centro di Geodesia Spaziale e dall'Enea finanziate per un importo complessivo di 20 Meuro di cui 10 Meuro a titolo di contributo del PO FESR Basilicata 2014/2020 (D.G.R. n. 926 del 14 settembre 2018; DD.DD. 15AB.2018/D.2345 del 20 dicembre 2018 e 15AB.2019/D.591 del 2 aprile 2019). I due progetti sono in corso di attuazione e fanno registrare dei ritardi soprattutto connessi alle procedure di appalto per l'acquisto delle strumentazioni previste dai progetti

Un secondo Avviso è stato rivolto alle infrastrutture di ricerca incluse nel Piano Triennale regionale delle IR per un totale di 14,2 Meuro (D.G.R. n. 227 del 19 marzo 2019; D.G.R.n. 402 del 28 giugno 2019). Con l'Avviso si è inteso finanziare cinque IR, una per ciascuna area di specializzazione e alla scadenza (12 agosto 2019) sono pervenute n. 10 istanze nelle seguenti aree di specializzazione: n. 4 bioeconomia; n. 2 automotive; n. 2 aerospazio, n. 1 all'industria culturale e creativa e n. 1 energia, per un totale di contributo richiesto pari a 16,73 Meuro. L'avviso ha previsto una articolazione in due distinte fasi.

All'esito della prima fase, finalizzata alla valutazione dei progetti preliminari, n. 2 istanze sono state valutate non ricevibili e non ammissibili e n. 8 istanze ammissibili alla seconda fase. Entro la scadenza del 28 settembre 2020 sono stati candidati alla seconda fase di valutazione n. 5 progetti definitivi (1 per l'area di specializzazione Industria culturale e creativa, 1 per l'area di specializzazione Automotive, 1 per l'area di specializzazione aerospazio, 2 per l'area di specializzazione bioeconomia) la cui valutazione di merito si è conclusa nel mese di novembre 2020. Dei cinque progetti candidati, un progetto è stato ritenuto non ammissibile e n. 4 progetti ammissibili a finanziamento per un totale di contributo richiesto di circa 1,08 Meuro. La graduatoria è stata approvata con DD.15AB.2020/D.01795 del 6 dicembre 2020.

E' stato cofinanziato il **Piano Strategico Nazionale dell'Aerospazio** gestito dal MISE con una partecipazione finanziaria regionale di 5,5 Meuro suddivisa sui programmi "Mirror GOV/SAT/COM" per 1,5 Meuro e "Mirror COPERNICUS per 4 Meuro (D.G.R. n. 208 del 09 marzo 2018 e D.G.R. n. 565 del 6 agosto 2020).

Con D.G.R. n. 565 del 6 agosto 2020 si è preso atto del Protocollo di Intesa per l'attuazione del Piano Multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del programma "MIRROR COPERNICUS", nell'ambito della linea di intervento sul Programma Osservazione della terra, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni interessate, sottoscritto dal Presidente della Regione Basilicata in data 20/04/2020. Il programma è in corso di attuazione.

Nell'ambito del Progetto Mirror GOV/SAT/COM è stata finanziata la proposta progettuale denominata "I-FASENET" presentata dalla società capofila Tekne S.r.l., alla quale è stata riconosciuta una valenza nazionale. Nel partenariato di progetto sono coinvolte 5 aziende appartenenti alle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte e Basilicata e per la Basilicata partecipa la società Digimat S.p.A., beneficiaria dell'aiuto a valere sulle risorse del POR FESR. Con D.G.R. n. 566 del 6 agosto 2020 si è preso atto dello schema di Accordo per l'Innovazione tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Abruzzo, la Regione Basilicata, la Regione Lazio, la Regione

Piemonte e Tekne S.r.l., Elital S.r.l., Digimat S.p.a., Tiesse S.p.a, Reiss Romoli S.r.l. Il valore complessivo del Progetto I-FASENET è di circa 11 Meuro mentre la quota a carico del MISE e delle Regioni interessate è di circa 6 Meuro di cui 1,5 Meuro a carico della Regione Basilicata.

Si è concluso a fine gennaio 2020 il servizio di supporto all'innovazione delle PMI mediante l'Intermediario dell'innovazione (progetto "**T3 Innovation**") per circa 9,9 Meuro (D.G.R. n. 1654 del 15 dicembre 2015). Le principali attività messe in campo da T3 Innovation sono state finalizzate principalmente a supportare i processi di innovazione e trasferimento tecnologico delle imprese lucane. Sono stati interessati dai servizi dell'intermediario dell'innovazione 500 imprese.

Di seguito si riporta il link che rimanda sul sito del Programma ad una scheda riepilogativa del progetto: <http://europa.basilicata.it/fesr/procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-consulenza-strategica-e-gestionale-in-materia-di-trasferimento-tecnologico-finalizzato-alla-valorizzazione-delle-potenzialita-di-innovazione/>

La spesa rendicontata dai beneficiari ad oggi ammonta a 8,95 Meuro.

A valer sull'asse sono state selezionate anche operazioni nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza (per le quali si rinvia al paragrafo 5.2).

4.2 ASSE 2 - AGENDA DIGITALE

La sfida dell'Asse 2 è di assicurare il superamento delle difficoltà di accesso alla rete annullando il digital divide e diffondendo la banda ultra larga ("fattore abilitante") sull'intero territorio regionale a favore delle pubbliche amministrazioni (P.A.), dei cittadini e delle imprese.

Altri obiettivi dell'Asse sono:

- la realizzazione della cosiddetta "Pubblica Amministrazione digitale" attuando soluzioni tecnologiche per l'innovazione dei processi interni ai vari ambiti della P.A. nel quadro del Sistema pubblico di connettività (soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi amministrativi ed azioni per lo sviluppo della Sanità Digitale);
- la realizzazione di servizi innovativi destinati ai cittadini e al mondo delle imprese (quali la fatturazione e i pagamenti elettronici; sistemi di e-government ed e-procurement).

Al 5 dicembre 2020 sono 141 le operazioni selezionate a valere sull'Asse 2 (OT2). Fra le principali operazioni/progetti avviati si riportano i seguenti.

- **"Programma Basilicata 30Mega - BUL II Lotto funzionale"** (beneficiari: 39 comuni e 1 area industriale) - 9,207 Meuro (D.G.R. n. 943/2014). I lavori, realizzati da TIM, sono terminati nel 2017.
- Per l'operazione **"BUL nella Regione Basilicata"**- 14,639 Meuro, a cui si aggiungono risorse PON I&C e FEASR (D.G.R. 854/2016) (beneficiari 65 comuni, 3 aree industriali e 17 aree produttive) l'operatore Open Fiber ha avviato i lavori a luglio 2018. L'Accordo sottoscritto dalla Regione e dal MISE prevedeva che l'operazione afferente il territorio della Basilicata fosse ultimata entro il 31 dicembre 2018; tuttavia, a causa dei ritardi nell'avvio dei lavori, è stato concordato un aggiornamento con il MISE/Infratel a novembre 2020 del cronoprogramma e del piano tecnico prevedendo la fine dei lavori per il 75% dei comuni a dicembre 2021 e per il restante 25% a marzo 2022. Nel corso del 2019 e del 2020 la Regione Basilicata, per l'attuazione del piano per la Banda Ultra Larga, ha indetto complessivamente 7 Conferenze di Servizi decisorie, ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - forma semplificata in modalità asincrona, ciascuna delle quali ha interessato diversi Enti locali, le altre amministrazioni e le società titolari di pubblici servizi di cui 5 nel 2019 e 2 nel 2020. Risultano concluse n. 6 Conferenze di Servizi e l'ultima Conferenza relativa agli ultimi 9 comuni verrà indetta entro la fine di dicembre 2020. A fronte dell'analisi puntuale di copertura delle Unità Immobiliari (UI) effettuata da Infratel SpA, grazie anche ai dati ottenuti dal Concessionario dal Catasto, per 26 comuni è stata riscontrata una percentuale di copertura in banda ultra larga maggiore del 95% per le aree del comune previste a bando come obbligatorie. Per tali Comuni il Ministero dello Sviluppo Economico ed Infratel Italia SpA, - come comunicato alla Regione Basilicata con nota del MISE U.0051360 del 19-10-2020 - hanno stabilito un strategia comune a livello nazionale che prevede di non intervenire in quanto, essendo quasi completa la copertura calcolata sulla base della geolocalizzazione puntuale dei civici coperti, si è ritenuto più efficace rimandare la copertura delle poche UI residuali al piano aree grigie. Per n. 86 comuni sono stati avviati i lavori e di questi per 38 i lavori si sono conclusi, per fine anno si concluderanno i lavori per altri due comuni. Spesa rendicontata dai beneficiari: 6,089 Meuro.
- Implementazione dei servizi digitali **"Data Center Unico Regionale"** -11,071 Meuro (D.G.R. n. 1346/2018). L'operazione intende realizzare l'implementazione dei servizi digitali mediante un percorso di razionalizzazione e definizione di un Data Center avanzato e funzionale alla condivisione di dati tra Amministrazioni pubbliche, nonché alla conservazione digitale in piena sicurezza ed alla possibilità di erogare servizi secondo il paradigma del cloud computing e della circolarità anagrafica. Sono stati acquistati

mediante Consip server e licenze propedeutiche all'operazione. Per la messa in sicurezza degli impianti dei locali regionali che dovranno ospitare il data center è stato affidato nel corso del 2020 il progetto esecutivo aderendo ad una convenzione Consip. Sempre mediante convenzione Consip verrà affidata la progettazione esecutiva e la realizzazione del Data center i cui lavori si concluderanno a dicembre 2021.

Spesa rendicontata 1.214 Meuro.

- **"Fascicolo Sanitario Elettronico"** - 6 Meuro (D.G.R. n. 856/2017). A febbraio 2020 si è avviata l'attività di implementazione che consentirà di rendere disponibili ai soggetti autorizzati informazioni cliniche rilevanti su ciascun assistito.
- l'implementazione del **"Fascicolo Sociale dell'Assistito"**- 2,5 Meuro (D.G.R. n. 859/2017) il cui servizio è stato aggiudicato in data 19/09/2019. A marzo 2020 è stata avviata l'esecuzione dell'intervento che consentirà di sanare una situazione di "carenza conoscitiva" sui bisogni e sulla domanda di servizi socio-assistenziali della popolazione lucana.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,357 Meuro.

- **Operazione "eCitizen Servizi ed azioni di supporto finalizzate alla diffusione dell'identità e domicilio digitale"** -1,6 Meuro (D.G.R. n. 1355/2018) per la fruizione digitale dei servizi pubblici da parte dei cittadini della Regione, nonché dei profili sanitari di sistemi integrati di autenticazione e firma. In data 18/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo nonché il piano di lavoro generale secondo le modalità previste dalla convenzione CONSIP. L'operazione è in corso di attuazione. Sono state consegnate agli utenti circa 6.000 firme digitali.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,912 Meuro.

- **Operazione "Apparati Wi-Fi nei comuni e nelle aziende Sanitarie ed ospedaliere regionali"** - 5,6 Meuro. L'operazione finanziata (D.G.R. n. 1320/2018) si compone di due progetti:
 - o **"Apparati Wi-Fi nei Comuni, nell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e nelle aziende ospedaliere regionali"** avente quale beneficiario la Regione Basilicata per 5,4 Meuro. Entro fine anno è prevista l'acquisizione del progetto definitivo tramite convenzione Consip.
 - o **"Apparati Wi-Fi nell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)"** avente quale beneficiario l'ASM per 0,169 Meuro. Nel 2019 l'installazione è stata completata in tutte le sedi dell'Azienda Sanitaria di Matera.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,156 Meuro.

- **l'Operazione "E-government-Osservatorio della condizione abitativa"** - 0,5 Meuro (D.G.R. n. 814/2019) consentirà di implementare un nuovo strumento informativo a supporto dei Comuni e delle ATER.

4.3 ASSE 3 – COMPETITIVITÀ

L'Asse 3 contribuisce allo sviluppo delle imprese e al riposizionamento competitivo dei segmenti produttivo-territoriali presenti in Basilicata.

Gli obiettivi prefissati nell'Asse saranno raggiunti principalmente attraverso interventi di:

- sostegno alla nascita di nuove imprese;
- rigenerazione dei sistemi produttivi locali maggiormente in crisi,
- sostegno alle imprese operanti nelle cinque aree di specializzazione della strategia regionale S3;
- attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria per il superamento delle difficoltà delle PMI ad accedere al credito.

Per quanto concerne l'Asse 3 (OT3) sono state selezionate n. 16.032 operazioni riferibili alle seguenti procedure:

- **Pacchetto di agevolazione, con procedura a sportello "CreOpportunità"**. La finalità generale del Pacchetto "CreOpportunità" è quella di favorire e stimolare l'imprenditorialità lucana mediante il sostegno all'avvio ed allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio, dell'artigianato, del turismo, della cultura, dell'intrattenimento, del sociale, nonché di incentivare le professioni. Importo di 31,5 Meuro. La dotazione del pacchetto agevolativo è stata suddivisa in 4 finestre, l'ultima delle quali si è chiusa il 7 maggio 2018. In totale sono pervenute 1.745 domande, delle quali n. 613 risultano finanziabili sulla base delle risorse disponibili. Alla data del 05/12/2020 sono stati finanziati 405 progetti (di cui 33 sull'ITI Potenza e 26 sull'ITI Matera), con un contributo complessivo di 23,76 Meuro ed una spesa pari a 7,75 Meuro. Si prevede che entro il 30 giugno 2021, andando a scadenza le prime tre finestre, la spesa possa raddoppiare;
- **Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale** attraverso Pacchetti integrativi di agevolazioni (**c.d. Bando "Mini PIA"**) realizzati nelle aree dei Sistemi locali del Lavoro eleggibili ad aree di crisi di cui al DM del 4 agosto 2016 – Importo 27 Meuro. Il bando ha visto la partecipazione di 111 imprese di cui 44 sono state finanziate per una spesa complessiva di 27,15 Meuro. Al 05/12/2020, la spesa certificata è pari a 2,63 Meuro e si prevede che, entro il prossimo 30 giugno, la spesa si attesterà a circa 4,00 Meuro.
- **Agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali** – Importo 3,0 Meuro. E' stata trasferita al MISE (organismo intermedio) la somma di 0,50 Meuro quale quota parte del contributo della Regione Basilicata, pari a 2.025.000 euro, sul fondo rotativo ex legge 181/89 gestito da Invitalia a supporto del finanziamento della quota dell'agevolazione da erogare alle imprese sotto forma di finanziamento. E' in fase di predisposizione con il MISE l'avviso riservato alle imprese ubicate nelle aree di crisi.
- **Interventi per il rilancio del sistema produttivo regionale con i strumenti di incentivazione "Bando Pia"** – Sono state ammesse a rendicontazione 32 operazioni da parte di imprese operanti nei settori S3 per una spesa certificata, al 05/12/2020, pari a 34,41 Meuro.
- **Cofinanziamento della misura del credito di imposta nazionale** *ex art. 1, commi 98-108 della legge 28/12/2015, n. 208 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità 2016), a beneficio delle PMI lucane operanti nei settori di specializzazione della S3 della Regione Basilicata* – Importo 23 Meuro. È stata certificata la somma di 18,628 Meuro per il finanziamento di 398 imprese che hanno usufruito della misura.
- **Avviso Pubblico a favore dei Comuni di Basilicata per la realizzazione di interventi di riqualificazione nelle aree produttive.** Sono state finanziate 28 operazioni relative ad altrettante aree produttive, di cui n. 5 a valere sull'Asse 4 – "Energia" (importo 0,855 Meuro) e n. 23 a valere sull'Asse 3 (importo di 9,145 Meuro). Sono stati sottoscritti gli Accordi di programma tra Regione e Comuni che

consentono l'attivazione degli interventi (Importo complessivo 10 Meuro - D.G.R. n. 226 del 19 marzo 2019

In relazione alle 23 operazioni finanziate a valere sull'Asse 3 per 5 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, 2 interventi sono in esecuzione, la restante parte in progettazione, per lo più esecutiva.

Riguardo le 5 operazioni finanziate a valere sull'Asse 4, per 2 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, per 1 operazione è terminata la fase di progettazione esecutiva e 2 operazioni sono in fase di progettazione preliminare.

- **Avviso pubblico a favore delle imprese operanti nelle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo** – Importo 12,6 Meuro - Sono state ammesse a finanziamento 98 aziende ed a breve saranno emessi altri 17 provvedimenti di ammissione per altrettante aziende. Si è proceduto anche allo scorrimento della graduatoria e si conta che entro il prossimo febbraio verranno ammesse altre 34 aziende. Alla data del 05/12/2020 non vi è spesa certificata.
- **Avviso Pubblico per facilitare l'accesso al credito delle PMI – Integrazione Fondi Rischi dei Confidi** - Importo 10,0 Meuro di cui 5 Meuro a valere sul POR FESR. La Regione Basilicata con D.G.R. n. 719 del 31 luglio 2018 ha preso atto della "*Valutazione ex ante degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013*" e, conseguenzialmente, è stato approvato, con D.G.R.n. 1058 del 19/10/2018, l'Avviso Pubblico per l'integrazione fondi rischi dei confidi, al quale hanno partecipato tre Confidi. A febbraio 2019 si è preso atto degli esiti dell'attività istruttoria ammettendo i tre i Confidi partecipanti. Gli accordi di finanziamento sono stati sottoscritti in data 19 marzo 2019 per due dei Confidi e il 10/04/2020 per il terzo. Ad oggi sono state trasferite risorse pari a 7,51 Meuro e concesse garanzie a favore di oltre 1000 PMI. Con D.G.R. 546 del 17/07/2020 è stato approvato lo schema di addendum agli accordi di finanziamento già sottoscritti al fine di differire il termine per la concessione delle garanzie al 30 giugno 2023 e di concedere ai Cofidi l'autorizzazione ad operare ai sensi dell' art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) e gli artt. 1 e 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità) che prevedono oltre alla concessione di una garanzia pubblica a fronte dei finanziamenti concessi dalle banche a valere sul fondo istituito dall'art. 2, comma 100 della legge 662/1996, anche la possibilità che per le operazioni garantite al 90% dal suddetto fondo, intervenga la controgaranzia di un cofidi per garantire la rimanente quota del 10% per le operazioni finanziarie rivolte ad imprese con ricavi fino a 3.200.000 euro.

In risposta alla crisi generata dalla pandemia da Covid19, che ha colpito la Basilicata con importanti ripercussioni sull'intero contesto territoriale determinando una emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale con risvolti negativi per tutti i settori produttivi, la Regione Basilicata, a seguito di specifiche disposizioni comunitarie e nazionali tese ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, a valere sull'Asse 3 del Programma, ha attivato, per mitigare tali effetti e per sostenere la ripresa delle PMI e dei professionisti, i seguenti Avvisi:

- **Avviso Pubblico "Incentivi per l'adozione di piani aziendali di smart-working"** per un importo complessivo pari a 3 milioni di Meuro euro di cui 2 Meuro a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 (D.G.R.n.198 del 20 marzo 2020) Sono state ammesse al finanziamento 151 imprese per un costo ammesso di 0.5 Meuro. Si prevede di erogare tutti i contributi entro il 30 giugno 2021;
- **"Avviso Pubblico "Bonus liberi professionisti"**, per un importo pari a 5,389 milioni di euro (la D.G.R.n.273 del 21 aprile 2020 come da ultimo integrata con D.G.R.n.397 del 17 giugno 2020). L'avviso ha visto la partecipazione di 5252 professionisti che sono stati tutti finanziati per una spesa certificata di 5,33 Meuro.
- **"Avviso Pubblico "Fondo perduto alle microimprese"**, per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro di cui 13 Meuro a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 (D.G.R.n.357 del 27 maggio 2020

come da ultimo integrata con D.G.R.n.393 del 17 giugno 2020). Per l'avviso sono state finanziate 8130 istanze pervenute dalle PMI lucane per un costo ammesso di 11,636 Meuro ed una spesa certificata, alla data del 05/12/2020, pari a 9,68 Meuro. Per il prossimo 30 giugno 2021 si prevede di erogare tutti i contributi rimanenti.

- **"Avviso Pubblico "Pacchetto Turismo Basilicata"** per un importo complessivo pari a 23 Meuro di cui 22 Meuro a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020 (D.G.R.n.358 del 27 maggio 2020 come da ultimo integrata con D.G.R.n.450 del 2 luglio 2020). L'avviso ha visto la partecipazione di 1494 imprese che sono state tutte ammesse al finanziamento con una spesa certificata, alla data del 05/12/2020, pari a 9,68 Meuro. Si prevede di erogare, entro il prossimo 30 giugno, la parte rimanente delle sovvenzioni.
- **"Avviso Pubblico "Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale"** per un importo pari a 9,660 Meuro (D.G.R.n.274 del 21 aprile 2020). Sono pervenute 69 istanze che sono in fase di valutazione.
- **Avviso Pubblico "Contributo alle imprese lucane per far fronte alla tari 2020"** per un importo di 20,00 Meuro (D.G.R. 885 del 4 dicembre 2020). Il bando mira a ristornare all'80% la spesa relativa alla Tari 2020 per le PMI lucane ed è in corso di pubblicazione.

Nell'Accordo firmato il 6 agosto u.s, citato in premessa, tra la Regione Basilicata ed il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, sono stati allocati circa 33 milioni di euro dell'asse 3 sulle misure nazionali connesse all'emergenza Covid a favore delle imprese, in particolare sul Fondo Centrale di Garanzia. E' in corso di condivisione con il MISE lo "Schema di **Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'economia e delle Finanze e la Regione Basilicata per l'istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**" che si prevede di sottoscrivere a gennaio 2021. Ad oggi, sono state già erogate garanzie per 11,4 Meuro a favore di oltre 1.200 imprese lucane e si prevede di raggiungere circa 20 milioni di euro entro il 30 giugno 2021.

A marzo 2020, per tener conto dei disagi dovuti allo stato di emergenza, la Giunta ha prorogato i termini di scadenza su alcuni Bandi del POR FESR 2014/2020 con riguardo all'avvio e/o alla conclusione dei programmi di investimento delle imprese (D.G.R. n. 196 del 20 marzo 2020).

A valere sull'asse sono state selezionate anche operazioni nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza (per le quali si rinvia al paragrafo 5.2).

A valere sull'Asse sono state selezionate anche operazioni nell'ambito dell'ITI Aree interne (per le quali si rinvia al paragrafo 5.1).

4.4 ASSE 4 - ENERGIA E MOBILITÀ URBANA

L'Asse 4 contribuisce all'efficientamento dell'uso dell'energia nelle aree industriali, nelle imprese e negli edifici pubblici, nonché all'ampliamento della produzione energetica da fonti rinnovabili ed all'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Nello specifico si intende:

- migliorare le performance energetiche nelle imprese e nelle strutture produttive sostenendo investimenti in tecnologie per l'efficienza energetica delle strutture aziendali e per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo;
- abbattere i costi energetici negli insediamenti produttivi sostenendo investimenti di efficientamento energetico di reti e servizi erogati a vantaggio delle imprese insediate nelle aree industriali ed artigianali;
- migliorare le performance energetiche degli immobili e delle reti delle Pubbliche Amministrazione;
- rafforzare e migliorare la mobilità collettiva ed i sistemi di trasporto nelle città di Potenza e Matera.

Con riguardo all'Asse 4 - (OT4), sono state selezionate 273 operazioni. Tra le principali procedure/operazioni giova ricordare:

L'Avviso Pubblico Efficientamento Energetico delle Imprese che prevede quali beneficiari le PMI e le grandi Imprese per un importo complessivo pari a 27,322 Meuro di cui 21,103 Meuro sul Programma FESR. Sono state finanziate 193 imprese per un costo di 21,103 Meuro di cui 24 imprese hanno concluso l'investimento nel 2019. Nel 2020 altre 7 imprese hanno concluso l'investimento. Al 30 giugno 2021 tutte le imprese concluderanno l'investimento.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 6,952 Meuro.

- **L'Avviso Pubblico per la presentazione e selezione di operazioni sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids)** Importo complessivo di 13,925 Meuro (D.G.R. n. 1331/2018). Con l'avviso si è aderito al regime di aiuto per le infrastrutture elettriche di cui al Decreto MISE del 19 ottobre 2016 - Articolo 48 del regolamento GBER 651/2014. Finanziati con D.G.R. n. 1331/2018 tre operazioni di reti intelligenti di distribuzione dell'energia relative alle Cabine primarie di Potenza, di Matera e di Melfi che intendono superare le criticità significative che la Regione ancora presenta nell'accesso e nella fruizione dell'energia elettrica (congestioni, colli di bottiglia, perdite di rete e disservizi nelle interconnessioni) sia per usi civili che a fini produttivi. I progetti sono in corso di attuazione e interessano altresì circa 190 cabine secondarie nonché il rifacimento e il potenziamento di circa 60 km di linee di Media Tensione e l'interramento di circa 12 km di linee aeree a Bassa Tensione. Al 5 dicembre 2020 si registra un avanzamento di circa il 40% per il progetto di Potenza, 10% per il progetto di Melfi e del 2% per il progetto di Matera. I lavori dell'operazione di Matera saranno espletati principalmente nel 2021.
Spesa rendicontata: 5,569 Meuro.
- **il Progetto di efficientamento energetico dell'impianto dell'Ospedale San Carlo di Potenza** per un importo di 4,5 Meuro (D.G.R. n.1135/2018) intende realizzare un impianto di cogenerazione da fonte fossile che consentirà un minor consumo di energia primaria, grazie alla maggior efficienza del sistema. E' in corso la valutazione delle offerte tecniche relative alla gara per l'affidamento della progettazione definitiva e la relazione geologica che sarà conclusa entro il 2020.
- **la Procedura negoziata tra la Regione Basilicata e le Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale di Potenza e Matera** per la selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell'edilizia residenziale pubblica - Importo 5,950 Meuro (D.G.R. n. 1043/2018). La procedura prevede la

realizzazione di n. 7 operazioni per l'Ater di Potenza per un importo di 3,8 Meuro e n. 3 operazioni per l'Ater di Matera per un importo di 2,150 Meuro. Per le operazioni dell'Ater di Potenza risultano: n.1 intervento in esecuzione, n.2 interventi in corso di aggiudicazione dei lavori, n.1 intervento in fase di gara, n.3 interventi hanno concluso la progettazione esecutiva. Mentre per le operazioni dell'Ater di Matera nel 2020 si è conclusa la fase di progettazione esecutiva.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 2,380 Meuro.

- **Avviso Pubblico a favore dei Comuni di Basilicata per la realizzazione di interventi di riqualificazione nelle aree produttive** (come già riportato per l'Asse 3). Sono state finanziate 28 operazioni relative ad altrettante aree produttive, di cui n. 5 a valere sull'Asse 4 – "Energia" (importo 0,855 Meuro) e n. 23 a valere sull'Asse 3 (importo di 9,145 Meuro). Sono stati sottoscritti gli Accordi di programma tra Regione e Comuni che consentono l'attivazione degli interventi (Importo complessivo 10 Meuro - D.G.R. n. 226 del 19 marzo 2019).

In relazione alle 23 operazioni finanziate a valere sull'Asse 3 per 5 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, 2 interventi sono in esecuzione, la restante parte in progettazione, per lo più esecutiva.

Riguardo le 5 operazioni finanziate a valere sull'Asse 4, per 2 operazioni sono stati aggiudicati i lavori, per 1 operazione è terminata la fase di progettazione esecutiva e 2 operazioni sono in fase di progettazione preliminare.

A valere sull'Asse sono state selezionate anche operazioni nell'ambito dell'ITI Aree interne (per le quali si rinvia al paragrafo 5.1) e nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza (per le quali si rinvia al paragrafo 5.2).

4.5 ASSE 5 - TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

L'Asse 5 contribuisce in maniera significativa a superare il gap strutturale ed organizzativo sul ciclo integrato dei rifiuti, a rispondere agli obblighi della normativa dell'Unione in materia ambientale nel settore idrico e a mettere in atto progetti di valorizzazione culturale ed ambientale di alcuni siti ritenuti strategici in termini di attrattività turistica.

Nello specifico si provvederà a:

- riorganizzare il sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani, potenziando ed ammodernando la dotazione impiantistica regionale in tema di trattamento e recupero dei rifiuti e potenziando i sistemi di raccolta differenziata;
- migliorare la capacità di accumulo e distribuzione in rete della risorsa idrica; ridurre considerevolmente le perdite del sistema; elevare gli standard qualitativi di erogazione del servizio; migliorare il sistema depurativo regionale;
- promuovere l'attrattività della Basilicata incrementando la fruibilità del patrimonio architettonico e culturale e qualificando gli "attrattori".

A valere sull'**Asse 5** (OT6) risultano selezionate 309 operazioni inerenti la valorizzazione a fini turistici ed ambientali, l'ambito del ciclo integrato dei rifiuti e il settore delle risorse idriche e depurazione.

SETTORE DEI RIFIUTI

In materia di rifiuti per quanto attiene i **centri comunali di raccolta** a supporto della raccolta differenziata, sul primo Avviso (D.G.R. n. 374 del 30 aprile 2018, D.G.R. n. 325 del 29 maggio 2019) sono state finanziate 45 operazioni (10,58 Meuro). Ad oggi risultano in esecuzione n. 7 interventi, per 30 interventi l'Ufficio regionale competente ha approvato le progettazioni esecutive, mentre per altri 8 interventi è in fase di approvazione la progettazione esecutiva. Nel 2020 sul secondo Avviso (D.G.R. n. 1159 del 09 novembre 2018, D.G.R. 612 del 12 settembre 2019, D.G.R. n. 145 del 2 marzo 2020; D.G.R. n. 330 del 15 maggio 2020) sono stati finanziati ulteriori 20 operazioni (3,9 Meuro), di cui l'Ufficio regionale ha provveduto ad approvare le relative progettazioni esecutive. Nel 2020, inoltre, è stato approvato il terzo Avviso (D.G.R. n. 331 del 15 maggio 2020) sui centri comunali di raccolta dell'importo di circa 3 Meuro, di cui 2 Meuro a valere sul PO FESR e 1 Meuro a valere sul Patto per lo Sviluppo della Basilicata – FSC 2014-2020. È in fase di approvazione la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento.

La procedura negoziata finalizzata alla selezione di interventi per la realizzazione di **dotazioni impiantistiche di trattamento dei rifiuti** (D.G.R. n. 628 del 21 giugno 2017, D.G.R. n. 559 del 21 giugno 2018 e D.G.R. n. 560 del 21 giugno 2018, D.G.R. n. 1010 del 2 ottobre 2018, D.G.R. n. 406 del 28 giugno 2019), avente quali beneficiari i Comuni ed EGRIB (Importo 20 Meuro a valere sul PO FESR Basilicata), ha consentito di ammettere a finanziamento 7 operazioni coerenti con il Piano regionale rifiuti. Il 26 maggio 2020 è stato sottoscritto l'Accordo tra Regione, EGRIB ed i Comuni beneficiari per l'attuazione delle operazioni selezionate.

Una operazione è in fase di esecuzione (Realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione umida del Comune di Venosa dell'importo di 4.843 Meuro), per i restanti interventi i Comuni beneficiari sono impegnati nella redazione delle progettazioni definitive e/o esecutive.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 2,073 milioni di euro.

E' stata attivata un'operazione per la sensibilizzazione e promozione **di campagne di informazione sulla raccolta differenziata** nel territorio della Regione Basilicata (Importo 0,5 Meuro D.G.R. n. 148 del 25 febbraio 2019). La procedura di affidamento per la progettazione della campagna è stata espletata. Entro la fine di dicembre la campagna di informazione sulla raccolta differenziata sarà approvata.

CICLO DELL'ACQUA

Per la **risoluzione della procedura di infrazione** in materia di collettamento e depurazione e per **elevare gli standard qualitativi di erogazione del servizio** aumentando la quota di popolazione equivalente urbana servita da impianti di depurazione per il trattamento secondario e terziario dei reflui, nell'ambito della medesima procedura negoziata (D.G.R. n. 1286 del 8 novembre 2016, D.G.R. n. 435 del 19 maggio 2017, D.G.R. 624 del 3 luglio 2018 – Importo complessivo: 32,826 Meuro) nel 2020 sono state finanziate sul PO FESR (D.G.R. n. 233 del 9 aprile 2020) ulteriori 12 operazioni (risorse aggiuntive pari a 7,42 Meuro).

Ad oggi si sta dando corso all'attuazione del programma di interventi finanziati:

- una operazione ("Adeguamento delle reti fognarie del comune di Maratea" – Importo di 6,197 Meuro), è in fase di conclusione. L'intervento è volto ad ammodernare e razionalizzare l'intero sistema fognario e della depurazione di Maratea e prevede l'utilizzo di tecnologie innovative, sperimentate per la prima volta in Italia nel campo dell'ingegneria idraulica, con la realizzazione di una nuova condotta sottomarina.
- per n. 4 operazioni la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) ha in corso le gare per l'affidamento dei lavori;
- n. 6 operazioni sono in fase di progettazione esecutiva;
- n. 8 operazioni sono in fase di progettazione definitiva;
- per n. 4 operazioni devono essere affidate le progettazioni definitive.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 8,669 milioni di euro.

Nell'ambito della **procedura negoziata in materia di adduzione e riduzione delle perdite** (D.G.R. n. 561 del 13 giugno 2017, D.G.R. n. 522 del 31 luglio 2019) si è concluso l'iter di selezione delle operazioni e sono state finanziate sul PO FESR n. 4 operazioni (Importo di 11 Meuro) per la revisione degli impianti di sollevamento idrico regionali e l'ammodernamento delle relative apparecchiature.

Il tema dell'efficienza energetica riveste, infatti, un'importanza fondamentale per garantire la sostenibilità economica della gestione ma anche per promuovere l'innovazione tecnologica sostenibile ("ecoinnovazione") e la competitività del servizio, in una regione come la Basilicata, che si estende per circa 10 mila chilometri quadrati, gran parte dei quali montani e collinari, e nella quale, di conseguenza, sono molto alti i consumi di energia che derivano dalla necessità di sollevare l'acqua.

I capitolati di gara per l'acquisto delle forniture di cui alle succitate operazioni sono stati trasmessi alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, che ha in corso di attivazione le gare per l'acquisto delle forniture.

Per quanto attiene invece la **procedura per il miglioramento delle capacità di invaso** (D.G.R. n. 881 del 31 Agosto 2018, D.G.R. n. 277 del 21 aprile 2020), importo 4,71 Meuro a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020, con D.G.R. n. 751 del 19 luglio 2017 la Regione Basilicata ha finanziato in stralcio l'intervento attuato da EIPLI e concluso: "*Traversa sul torrente Sarmento – Interventi di ripristino dell'efficienza idraulica del canale di derivazione tra la traversa e l'imbocco della galleria e di rifunzionalizzazione parziale dell'opera di presa*" (Importo 0,75 Meuro), di rilevanza strategica per la Regione perché consente il recupero di 80 milioni di mc annui di acqua da invasare nella Diga di Monte Cotugno, aggiuntivi rispetto ai 471 milioni di mc di acqua invasati ad oggi.

Sono state finanziate ulteriori 4 operazioni (Importo 3,96 Meuro), di cui una in esecuzione e le restanti in fase di progettazione definitiva, volte all'efficientamento delle opere di sbarramento ed all'aumento della capacità

di invaso di alcune delle più importanti dighe della Basilicata (Diga di Monte Cotugno, Diga del Pertusillo, Diga Camastra).

L'aumento nelle disponibilità complessive dell'invaso comporterà incremento della continuità e dell'efficienza nella distribuzione delle portate derivate nelle dighe, che sono destinate a usi plurimi (potabile, irriguo, industriale) della Regione Basilicata ma, in parte, anche delle vicine Regioni Puglia e Calabria.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,914 Meuro.

VALORIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE

Sull'**Avviso Basilicata Attrattiva** (D.G.R. n. 833 del 4 agosto 2017 – D.G.R. n. 645 del 10 luglio 2018 - D.G.R. n.913 del 10 settembre 2018) rivolto ai Comuni sono stati finanziati 27 interventi che riguardano la valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale anche al fine di incentivare l'attrattività turistica. Al 5 dicembre 2020 tre interventi sono stati completati; i restanti sono in fase di attuazione (Importo circa 11,7 Meuro).

Spesa rendicontata dai beneficiari: 2,274 Meuro.

Finanziato ed in esecuzione l'intervento di **Recupero, restauro e valorizzazione delle emergenze storico - monumentali del Sagittario e del Ventrile - II Lotto** (Importo di 2,3 Meuro D.G.R. n. 832 del 4 agosto 2017) nell'ambito della procedura negoziata con gli Enti Locali proprietari del bene architettonico.

E' stato concluso l'allestimento della struttura polifunzionale **Basilicata Openspace** con aree museali, spazi per l'informazione turistica, sale per esposizioni ed eventi presso il Palazzo dell'Annunziata a Matera (Importo 0,711 Meuro D.G.R. n. 839 del 4 agosto 2017).

Si è inoltre investito sulla promozione delle destinazioni turistiche mediante la procedura negoziata con i **Comuni del Metapontino e il Comune di Maratea** (D.G.R. n. 393 del 11 maggio 2018 e n. 693 del 27 luglio 2018) per la selezione di interventi volti alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali che riguardano per lo più la sistemazione delle aree e percorsi attigui al mare (Importo 7 Meuro). Nel 2020 sono stati approvati 5 progetti definitivi dei Comuni del Metapontino Rotondella, Policoro, Bernalda Pisticci e Novasiri; ed il comune capofila (comune di Policoro) ha trasmesso la documentazione agli Uffici regionali competenti per la Valutazione d'incidenza ed il parere paesaggistico. Per gli altri due interventi (Comune di Scanzano Jonico e Comune di Maratea) è in corso la definizione dei progetti definitivi.

Per gli anni 2018 e 2019 è stato finanziato il grande evento nella città di Matera (Capitale della cultura 2019), ossia la diretta su RAI 1 ed in mondovisione della trasmissione **l'anno che Verrà - Capodanno RAI 2018 e Capodanno RAI 2019** (Importo complessivo di 1,220 Meuro - D.G.R. n. 1312 del 14 dicembre 2018 e D.G.R. n. 990 del 21 dicembre 2019).

Sono in corso di attuazione gli interventi per la promozione e fruizione del patrimonio naturale e culturale selezionati nell'ambito della **procedura negoziata con l'Azienda di Promozione Territoriale** di Basilicata (Importo 0,700 Meuro D.G.R. n. 1028/2019).

A valere sull'Asse sono state selezionate anche operazioni nell'ambito dell'ITI Aree interne (per le quali si rinvia al paragrafo 5.1) e nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza (per le quali si rinvia al paragrafo 5.2).

4.6 ASSE 6 - SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE

L'Asse 6 contribuisce a migliorare la rete ferroviaria regionale e la viabilità secondaria e terziaria, a favore delle "aree interne" regionali, per garantire tempi di accessibilità alle reti TEN-T minori rispetto a quelli attuali. In particolare si prevede di:

- migliorare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle "aree interne" con i principali assi viari e ferroviari;
- potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa, anche attraverso interventi infrastrutturali e tecnologici, rinnovo del materiale rotabile, promozione della bigliettazione elettronica integrata.

A valere sull'Asse 6 (OT7) risultano selezionate n. 79 operazioni.

VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE

In materia di viabilità è stata attivata la procedura negoziata che ha interessato i 42 comuni delle 4 aree interne e le Province di Potenza e Matera e che ha consentito il finanziamento di n. 59 operazioni in **materia di viabilità** (Importo 40 Meuro - DD.GG.RR. n. 1395 del 21 dicembre 2017 n. 27. n. 44 del 22 gennaio 2018 e n. 395 dell'11 maggio 2018) e altre 13 operazioni a titolo di overbooking con fondi CIPE/FSC. I progetti selezionati hanno riguardato i tratti stradali a maggiore flusso di traffico ed a servizio del maggior numero di centri abitati/abitanti delle aree interne. I km di rete interessati sono circa 200 che interessano tratte stradali pari a circa 370 km. Sono conclusi o in fase di conclusione i lavori per n. 9 interventi, di cui n. 3 nell'area interna Montagna Materana, n. 3 nell'Area Mercure Alto Sinni Val Sarmento, n. 2 nell'area Marmo Platano e n. 1 nell'area interna Alto Bradano. A queste operazioni si aggiungono ulteriori 10 operazioni in fase di attuazione, ossia con lavori avviati.

L'avanzamento attuativo dei progetti selezionati con la procedura attuativa citata congiuntamente agli interventi a titolo di overbooking, selezionati nell'ottica di rafforzare ulteriormente la connessione delle aree interne con le arterie stradali di rango superiore, sta contribuendo ad incrementare l'accessibilità delle aree marginali della Basilicata riducendo i tempi di percorrenza stradali.

La spesa rendicontata dai beneficiari ammonta a 15,459 Meuro.

VELOCIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA REGOLARITÀ D'ESERCIZIO DELLA RETE FERROVIARIA

Nella città di Potenza sono stati finanziati **due sottopassi** (via Roma e via Calabria, quest'ultimo inaugurato a luglio 2020) nell'ambito dell'operazione "Servizio ferroviario metropolitano hinterland potentino" che consentono l'eliminazione dei passaggi a livello migliorando notevolmente gli spostamenti all'interno della città (Importo 4,9 Meuro D.G.R. n. 246 del 28 marzo 2017).

Nell'ambito della procedura negoziata tra Regione Basilicata e Ferrovie Appulo Lucane sono in corso di realizzazione tre operazioni: l'adeguamento del **materiale rotabile**; l'attrezzaggio tecnologico del materiale rotabile e il raddoppio selettivo di Venusio nei pressi di Matera, sulla tratta Bari-Matera, -consentendo una riduzione dei tempi di percorrenza (Importo 12,48 Meuro - D.G.R. n. 881 del 4 agosto 2017, così come modificata con D.G.R. n. 723 del 20 ottobre 2020).

Sono stati finanziati due interventi per la realizzazione delle **aree d'interscambio modale** (presso le stazioni ferroviarie di Bella-Muro e di Ferrandina scalo-Matera (Importo 1,32 Meuro - D.G.R. n. 1399 del 21 dicembre 2017, D.G.R. 639 del 6 luglio 2018 e D.G.R. n. 723 del 20 ottobre 2020).

Le operazioni ammesse a finanziamento determineranno l'incremento dell'utilizzazione del servizio ferroviario in quanto consentono da una parte a mettere ad efficientare il sistema complessivo delle modalità trasportistiche (gomma e ferro) attraverso la realizzazione delle aree di interscambio e, dall'altra, a velocizzare e mettere in sicurezza alcune componenti del materiale rotabile e del sistema di mobilità pubblica regionale (rete ferroviaria FAL sulle direttrici da o verso le due città di Matera e Potenza, eliminazione dei passaggi a livello, adeguamento ed attrezzaggio tecnologico del materiale rotabile).

La spesa rendicontata dai beneficiari ammonta a 19,709 Meuro.

Le operazioni a valere sull'Asse inerenti la viabilità sono state selezionate nell'ambito dell'ITI Aree interne (per il quale si rinvia al paragrafo 5.1).

4.7 ASSE 7 - INCLUSIONE SOCIALE

L'Asse 7 contribuisce al miglioramento delle dotazioni strutturali e dei servizi a favore delle fasce svantaggiate ed economicamente fragili. In particolare, sono previsti investimenti finalizzati a:

- fornire una maggior copertura in termini di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia nonché a rafforzare e razionalizzare il sistema dei servizi residenziali destinati a minori e le prestazioni di assistenza ai giovani;
- potenziare l'offerta di servizio agli anziani, sia in termini residenziali quali case alloggio, strutture per utenti autosufficienti, che non residenziali quali centri diurni e centri intergenerazionali,
- consolidare il sistema di offerta residenziale per disabili e potenziare le strutture per la salute mentale;
- migliorare i servizi di assistenza primaria sanitaria e sociosanitaria;
- implementare nuove tecnologie presso i presidi territoriali e riorganizzare la rete del welfare di accesso e di costruzione di servizi secondo una logica di "ospedale di comunità", anche promuovendo la telemedicina;
- ammodernare e potenziare la rete di prima emergenza territoriale in aree non urbane al fine di riorganizzare e migliorare il servizio di primo soccorso, anche attraverso l'incremento delle dotazioni tecnologiche e il ricorso a strumentazione ICT.

Sono state selezionate a valere sull'Asse 162 operazioni.

SERVIZI ALLA PERSONA (INFANZIA, MINORI, ANZIANI, DISABILI)

Procedura negoziata per la selezione ed ammissione a finanziamento delle operazioni in materia di Inclusione Sociale – Importo 20,796 Meuro. La procedura si è chiusa con l'ammissione a finanziamento n. 119 operazioni per un importo totale di 20,7 Meuro ripartite in n. 55 operazioni sull'azione 9A.9.3.1 (infanzia e minori), per un importo di 8,7 Meuro, e n. 63 operazioni sull'azione 9A.9.3.5 (anziani e disabili), per un importo di 12,0 Meuro. Gli Accordi di Programma per l'attuazione delle operazioni tra la Regione e gli Ambiti socio-Territoriali sono stati sottoscritti tra fine luglio ed inizio agosto 2018. Ad oggi la percentuale di progettazione esecutiva disponibile per ciascuna delle 7 aree è la seguente: Alto Basento 74%, Marmo Platano 44%, Vulture Alto Bradano 62%, Lagonegrese 81%, Bradanica 79%, Metapontino 69%, Val D'agri 78%; sono in corso di esecuzione i lavori relativi a 55 progetti. Il risultato a cui punta l'intera procedura sarà fornire una maggior copertura in termini di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia nonché a rafforzare e razionalizzare il sistema dei servizi residenziali destinati a minori oltre che potenziare l'offerta di servizio ad anziani e disabili, sia in termini residenziali quali case alloggio, strutture per utenti autosufficienti, che non residenziali quali centri diurni e centri intergenerazionali.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 6,986 Meuro.

SERVIZI ALLA PERSONA (INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO)

- **Realizzazione della centrale operativa di Venosa** - Importo 0,500 M€. L'operazione rientra nel più ampio progetto di telemedicina territoriale attraverso il quale verranno potenziate le attività di ADI e di presa in carico del paziente cronico rafforzando la rete infrastrutturale e l'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. La realizzazione della centrale di Venosa rappresenta l'avvio di una quota parte del suddetto progetto generale che prevede risorse FESR per 2 M€ ed ulteriori risorse FSC per 7,825 Meuro, per un totale di 9,825 Meuro. I lavori sono stati aggiudicati a febbraio 2019 e si sono recentemente conclusi.

- **Rete radio unitaria regionale** – Importo 6,00 Meuro. E' stata avviata la redazione di un progetto contenente interventi di ammodernamento e potenziamento della rete di prima emergenza territoriale in aree non urbane finalizzate alla riorganizzazione e miglioramento del servizio di primo soccorso, anche attraverso l'incremento delle dotazioni tecnologiche e il ricorso a strumentazione ICT. Tale procedura selettiva è stata avviata con risorse FESR per 6,00 Meuro e prevede ulteriori risorse FSC (Patto per la Basilicata) per 6,00 Meuro, a titolo di overbooking, per un totale di 12,00 Meuro. L'aggiudicazione del servizio per realizzazione della rete radio è avvenuta fine maggio 2019 ed è in corso l'esecuzione dell'intervento.
- **Lavori di Realizzazione di un edificio da adibire a Centro per le cure palliative – Hospice nel Complesso Ospedaliero San Carlo di Potenza** – Importo 3,893 M€. E' stata finanziata la realizzazione di un padiglione Hospice nel complesso ospedaliero San Carlo per pazienti in fase critica e con limitata aspettativa di vita. Tale procedura selettiva è stata avviata con risorse FESR per 3,893 Meuro e prevede ulteriori risorse FSC per 1,106 Meuro, a titolo di overbooking, per un totale di 5,0 Meuro. Nel corso del 2020 è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di "Progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e redazione piano di sicurezza e coordinamento". A ottobre 2020 l'aggiudicazione non efficace. In corso i controlli per determinare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del D-Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.
- **Procedura negoziata tra Regione Basilicata e le aziende sanitarie di Potenza e Matera operazione di "Potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e non ospedalieri"** – Importo 4,897 Meuro. E' stata finanziata ed è in fase di conclusione l'operazione di potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari non ospedalieri avente quale beneficiario l'Azienda Sanitaria di Potenza (ASP) avente la finalità di riorganizzare ed ottimizzare le attività distrettuali sanitarie e socio – sanitarie allocando le stesse nell'immobile sito in Potenza alla Via della Fisica n. 18/A, in modo che in tale struttura saranno erogati i seguenti servizi: Consultorio familiare; Dipartimento salute mentale; Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana (Medicina del Lavoro, Servizio di Protezione e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione); Attività Amministrative e Sanitarie del Dipartimento di Salute Umana (Igiene e Sanità Pubblica); Neuropsichiatria infantile; 118; Servizio ADI; CEA; UVBR; U.O. Alunni Disabili; Farmacia Distrettuale.
Spesa rendicontata dai beneficiari: 4,886 Meuro.

Come misura straordinaria per fronteggiare l'Emergenza sanitaria da Covid -19 è stata ammessa a finanziamento l'operazione "**Potenziamento dei servizi sanitari**" (Importo 6,0 Meuro - D.G.R. n. 253 del 9 aprile 2020). L'operazione è volta a consentire l'incremento della strumentazione sanitaria, dei servizi di analisi e trattamento, dei dispositivi di protezione e medici.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 1,661 Meuro.

Di seguito si riporta un dettaglio delle principali tipologie degli acquisti effettuati:

Tipologia acquisti	Quantità	Data della consegna	Destinatari
Letti per terapia intensiva	30	03/04/2020	A.O.R. San Carlo
Ventilatori polmonari	20	05/05/2020	A.O.R. San Carlo (n. 12) A.S.M. - Ospedale Madonna delle Grazie (n. 8)
Monitor multiparametrici per pazienti in terapia intensiva	20	24/04/2020	A.O.R. San Carlo (n. 13) A.S.M. - Ospedale Madonna delle Grazie (n. 7)

Tipologia acquisti	Quantità	Data della consegna	Destinatari
Arredi completi a corredo di posti-letto da destinare a reparti Covid (escluso letti)	73	13/05/2020	A.S.P.
Letti di degenza, completi di accessori, (escluso arredi) da destinare a reparti Covid	30	23/04/2020	A.S.P.
Emogasanalizzatori (forniti in service per 6 mesi)	2	14/04/2020	A.S.P.
Tamponi per campioni rinofaringei	25.200	tra il 29/05/2020 e il 29/06/2020	Regione Basilicata
Mascherine Facciali FFP2 con valvola	50.000	10/10/2020	Regione Basilicata
Tute monouso impermeabili di terza categoria	3.000	tra il 20/10/2020 e l'11/11/2020	Regione Basilicata
Guanti monouso in nitrile	50.000	05/05/2020	Regione Basilicata
Occhiali protettivi	500	tra il 20/10/2020 e il 30/10/2020	Regione Basilicata
Altri DPI	1.500 visiere 1.060 maschere tipo Venturi 3.000 calzari caschi NIV, CPAP, ecc.	tra il 15/05/2020 e il 15/06/2020	Regione Basilicata

SISTEMA DEGLI ALLOGGI SOCIALI E DEI SERVIZI ABITATIVI

L'Avviso Pubblico per l'implementazione dell'edilizia sociale tesa alla valorizzazione a fini abitativi del patrimonio edilizio pubblico esistente – Importo 6,056 Meuro di cui 3,705 Meuro a valere sul PO e 2,351 Meuro quale cofinanziamento. L'Avviso Pubblico è rivolto ai soli comuni lucani ad Alta Tensione Abitativa (ATA: Melfi, Policoro, Venosa, Rapolla, Pignola, Tito) e la procedura si è conclusa con l'ammissione a finanziamento di interventi che consentiranno di finanziare n. 60 alloggi. L'operazione nel Comune di Venosa è stata revocata per rinuncia da parte del Beneficiario. Con D.D. n. 298 del 23/7/2020 e n. 342 del 20/8/2020 sono state approvate le progettazioni esecutive dei Comuni di Rapolla e Policoro. Rispetto all'importo stanziato all'origine l'economia di euro 0,375 è stata riprogrammata a luglio 2020 in fase di revisione del Por Fesr. Spesa rendicontata dai beneficiari: 1,482 Meuro.

A valere sull'Asse sono state selezionate anche operazioni nell'ambito dell'ITI Aree interne (per le quali si rinvia al paragrafo 5.1) e nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza (per le quali si rinvia al paragrafo 5.2).

4.8 ASSE 8 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE

L'Asse 8 contribuisce al miglioramento delle condizioni di fruibilità degli istituti scolastici ed al rafforzamento delle dotazioni in essi presenti al fine di contenere il rischio di abbandono scolastico e di elevare il numero di cittadini in possesso di competenze più facilmente spendibili sul mercato del lavoro. In particolare, sono previsti investimenti finalizzati a:

- riqualificare il sistema immobiliare scolastico e garantire maggiore sicurezza delle strutture, migliore resa energetica degli edifici, incremento delle dotazioni di impiantistica sportiva e degli spazi per laboratori;
- adeguare le dotazioni, gli spazi e le tecnologie a disposizione delle scuole per favorire approcci didattici innovativi e rafforzare la "scuola digitale".

A valere sull'Asse 8 (OT10) risultano selezionate 105 operazioni. Le principali procedure/operazioni riguardano:

- l'Avviso Pubblico "**Scuole Ospitali e Sicure**" con il quale sono stati selezionati 33 progetti finalizzati alla riqualificazione degli edifici e degli spazi scolastici per un importo di 11,630 Meuro (D.G.R. n.808 del 10 agosto 2018). Al 5 dicembre 2020 due operazioni si sono concluse; le restanti sono in corso di attuazione.
Spesa rendicontata dai beneficiari: 4,206 Meuro
- il progetto pilota "**One Class! Open Network**" (D.G.R.n. 1222/2016) di 907.680 € è finalizzato a far fronte al problema delle pluriclassi, soprattutto nelle aree interne, mediante il ricorso a tecnologie dell'informazione applicate alla didattica. Il progetto in corso di attuazione interessa 7 istituti scolastici e si concluderà nel corso del vigente anno scolastico.
Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,824 Meuro
- con l'operazione "**Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata**" (D.G.R. n. 247 del 28 marzo 2017, D.G.R. n. 1341 del 11 dicembre 2017 e D.G.R. n. 718 del 31 luglio 2018) sono stati stanziati 9 Meuro, di cui 4,162 Meuro a valere sul PO FESR e la restante parte su FSC/Patto Basso Basilicata, al fine di ridurre il digital divide interno al mondo della scuola e fornire un impulso notevole allo sviluppo del Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D). Il contributo del PO FESR Basilicata 2014-2020 è stato destinato prevalentemente agli Istituti scolastici le cui sedi sono ubicate nei 42 Comuni delle 4 aree interne di cui alla D.G.R. n. 489/2015. L'intervento ha mostrato la propria utilità anche durante la pandemia, per la possibilità delle scuole di fornire, in comodato d'uso, numerosi dispositivi (notebook e tablet) agli studenti che ne hanno fatto richiesta per utilizzarli per la didattica a distanza. Si prevede il completamento degli interventi entro la fine del 2020.
Spesa rendicontata dai beneficiari: 3,922 Meuro

Come misura straordinaria per fronteggiare l'Emergenza da Covid -19 è stato approvato l'Avviso pubblico "**Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l'acquisto di beni e dispositivi informatici**" (D.G.R.n. 633 del 17 settembre 2020) stanziando 3,785 Meuro a favore delle famiglie lucane in disagio reddituale. L'Avviso garantirà un bonus di 400 euro per l'acquisto di dispositivi utili sia per l'accesso ai servizi offerti dal web, con particolare riguardo ai servizi on line delle PA, sia per lo svolgimento dello smart working, sia per lo svolgimento della didattica tradizionale e a distanza da parte dei ragazzi in età scolare. E' in corso l'istruttoria delle circa 5.000 istanze pervenute da parte dei nuclei familiari con almeno un componente in obbligo scolastico.

A valere sull'Asse sono state selezionate anche operazioni nell'ambito dell'ITI Aree interne (per le quali si rinvia al paragrafo 5.1) e nell'ambito dell'ITI Sviluppo Urbano di Matera e Potenza (per le quali si rinvia al paragrafo 5.2).

5. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI (ITI)

5.1 STATO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE

Le **Aree Interne** individuate dal Programma sono **quattro** e riguardano 42 dei 131 comuni lucani:

- Montagna Materana;
- Mercure Alto Sinni Val Sarmento;
- Alto Bradano;
- Marmo Platano.

L'amministrazione regionale, al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nei Programmi Regionali per il periodo 2014-2020 in materia di ITI per le Aree Interne, ha messo in campo numerose attività negoziali con i territori funzionali alla definizione delle Strategie d'Area.

Con D.G.R. n. **53** del 31 gennaio 2017 *Programmazione comunitaria FESR, FSE, FEARS 2014-2020 - ITI Aree Interne - Ripartizione finanziaria delle risorse* si è provveduto a definire la **dotazione finanziaria dell' ITI Aree Interne** per ognuna delle 4 Aree secondo un criterio che tenesse conto di indicatori statistici fortemente rappresentativi delle caratteristiche peculiari della strategia delle Aree Interne afferenti alla dimensione demografica, con la relativa dinamica, nonché alla superficie territoriale delle aree stesse.

La dotazione complessiva destinata all'ITI Aree Interne assegnata con la sopracitata D.G.R.n. 53/2017 derivante dai tre Programmi regionali per il periodo 2014-2020 è pari complessivamente a 117,493 Meuro, di cui 90 Meuro a valere sul PO FESR, incluso l'importo destinato alla procedura negoziata in materia di viabilità descritta nell'asse 6.

A queste risorse si aggiungono le risorse derivanti dalle **Leggi di Stabilità** statale 2014, 2015 e 2016, 2017 a favore della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 183/1987 le quali assegnano 3,7 milioni di euro per ogni area regionale.

5.1.1 Area Interna Montagna Materana

La **Strategia** per l'Area Interna Montagna Materana riguarda 8 comuni: Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Stigliano situati al centro del territorio lucano con una popolazione pari a 11.515 abitanti. Tutti i comuni dell'area sono considerati ultraperiferici.

L'area prototipale **Montagna Materana** nel mese di maggio 2019 ha concluso l'iter di sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, il comune capofila e i Ministeri competenti. (D.G.R. n. 207 del 15 marzo 2019).

La copertura finanziaria delle operazioni di cui all'Accordo ammonta a 31,85 Meuro ed è assicurata dalle seguenti risorse: Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): Meuro 3,74 PO FESR Basilicata, Meuro 21,11, PO FSE Basilicata: Meuro 0,806 e PSR FEASR Basilicata: 5,51 Meuro.

Le risorse attivate nell'ambito del PO FESR Basilicata 2014-2020 hanno consentito di ammettere a finanziamento 13 interventi in materia di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione e degli edifici comunali in maniera diffusa su tutta l'area.

Altro tema portante della strategia riguarda le risorse naturali e culturali (2,257 Meuro) in cui sono stati finanziati 17 operazioni fortemente integrate tra loro dal punto di vista funzionale e riguardanti il sistema museale diffuso, i festival della montagna, l'ospitalità diffusa e un'azione di raccordo di tutti gli interventi in materia turistica.

Altro ambito di intervento è quello socio-sanitario (2,250 Meuro) con la selezione di 13 operazioni finalizzate a erogare servizi alla prima infanzia, agli anziani, alla popolazione in generale (elisoccorso in notturno) e alla rifunzionalizzazione dell'ospedale di Stigliano.

Completano il quadro i 6 interventi finalizzati al miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici (2,287 Meuro), quello per il potenziamento della didattica a distanza (0,187 Meuro) ed i 27 interventi in materia di viabilità (9,8 Meuro).

Gli interventi della strategia finanziati nell'ambito del PO FESR Basilicata 2014-2020 sono quasi tutti in fase di attuazione, mentre tre sono conclusi e riguardano la viabilità (già citati nell'ambito della descrizione dell'Asse 6).

La spesa sostenuta dai beneficiari per il complesso degli interventi ammonta a 4,795 Meuro.

5.1.2 Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento

L'Area Interna comprende i seguenti 19 Comuni: Francavilla in Sinni, Senise, Noepoli, Fardella, Calvera, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Terranova del Pollino, Cersosimo, Rotonda, Castelluccio Superiore, San Giorgio Lucano, Chiaromonte, Castronuovo di Sant'Andrea, San Severino Lucano, Teana, Viggianello, Carbone e Castelluccio Inferiore.

Nel 2019 la Giunta ha preso atto della Strategia dell'**Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento** ed ha ammesso a finanziamento in stralcio n.71 operazioni cantierabili (D.G.R. n. 255/2019 e n.392/2019). La Strategia e le relative schede d'intervento dell'**Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento** sono state approvate dal Comitato Tecnico delle Aree interne a febbraio 2020 e nel mese di marzo 2020 la Giunta ha provveduto alla relativa presa d'atto (D.G.R. n. 166 del 12 marzo 2020). L'11 novembre 2020 Agenzia per la Coesione ha comunicato l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro dell'Area interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento e.La Giunta regionale nella seduta del 4 dicembre 2020 ha preso atto dell'ApQ sottoscritto ed ha approvato lo schema di Accordo Attuativo per gli interventi a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020 con i beneficiari.

L'importo complessivo della Strategia d'area a valere sul PO FESR è pari a 30,187 Meuro e le operazioni selezionate ed ammesse a finanziamento sono 107 (comprese le 13 operazioni sulla viabilità pari a 13,4 Meuro).

La strategia dell'area interna prevede nell'ambito del turismo e dello sviluppo locale operazioni volte al potenziamento del flusso turistico (quali il potenziamento del Piano Giumenta a Terranova di Pollino, la valorizzazione del Pollino outdoor park a San Costantino Albanese nonché il miglioramento della fruibilità di piano Visitone a Viggianello o la riqualificazione dell'oasi naturalistica "Bosco Avena" di Francavilla in Sinni) ed operazioni volte ad ampliare l'offerta di esperienze culturali e del tempo libero (quali il percorso del monachesimo Basiliano e del relativo museo a Carbone e l'adeguamento funzionale di alcuni palazzi dall'alta valenza storico-artistica nel Comune di Calvera). Previsti interventi anche in tema di efficientamento energetico sugli edifici pubblici e sulla pubblica illuminazione (n. 25 operazioni).

Nel settore istruzione verranno realizzati interventi di miglioramento della fruibilità scolastica nonché, in chiave complementare, si interverrà al fine di adeguare le dotazioni, gli spazi e le tecnologie a disposizione delle scuole ad una didattica moderna e rispondente sia al fabbisogno formativo individuale che al contesto territoriale.

Saranno potenziati i servizi di emergenza-urgenza, in particolare, mediante la realizzazione di n.13 elisuperfici per l'elisoccorso notturno. Si interverrà anche su 9 infrastrutture per il sociale.

5.1.3 Area Interna Alto Bradano

L'Alto Bradano si compone di otto comuni: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Tolve e San Chirico tutti caratterizzati come periferici tranne il comune di Genzano di Lucani classificato come ultraperiferico. La popolazione residente è pari a 25.806 abitanti. L'area è caratterizzata da un forte afflusso di immigrati e dalla presenza dall'unica Unione di Comuni della Basilicata, costituita già a partire dal 2011.

Per l'Area **Alto Bradano** il Preliminare di Strategia e la Strategia dell'Area sono stati rispettivamente approvati dal Comitato tecnico delle Aree Interne a luglio 2019 e a settembre 2020. Con deliberazione n. 834 di novembre 2020 la Giunta Regionale ha approvato la Strategia dell'Area. L'area è quindi pronta per la sottoscrizione del relativo Accordo di Programma con l'Agenzia per la Coesione territoriale, i Ministeri competenti, il comune capofila e la Regione.

5.1.4 Area Interna Marmo Platano

Si tratta di un'area composta da 7 comuni: Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano e Ruoti, di cui tre caratterizzati come intermedi e due periferici e uno ultraperiferico. L'area si caratterizza per un'elevata percentuale di imprese straniere, pari al 6% del totale, dalla presenza di un'impresa manifatturiera di livello mondiale ed un indice di specializzazione delle imprese di energia, gas e acqua pari a 4,19 superiore alla media regione (1.6).

L'Area **Marmo Platano** ha completato le attività di scouting nel mese di novembre 2019. La Bozza di strategia è stata condivisa dal Comitato Tecnico delle Aree interne nel mese di marzo 2019. La strategia d'Area è stata approvata dal Comitato Aree interne il 10 dicembre 2020. Si procederà, pertanto, alla sottoscrizione del relativo Accordo di Programma con l'Agenzia per la Coesione territoriale, i Ministeri competenti, il comune capofila e la Regione.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 0,984 milioni di euro.

5.2 STATO DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO

Con la **D.G.R. n. 1190 del 19 ottobre 2016** sono state definite le Fasi relative alla procedura negoziale tra la Regione Basilicata e le città, lo Schema di Documento Strategico degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) Sviluppo Urbano e lo Schema di schede delle operazioni da selezionare.

5.2.1 ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza

Per la città di **Potenza**, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Regione e la Città di Potenza a settembre 2017 si è avviata l'attuazione dell'ITI Sviluppo Urbano (D.G.R. n. 836 del 04 agosto 2017). Per l'attuazione di alcuni interventi sono stati inoltre sottoscritti Accordi attuativi tra la Regione Basilicata, la città di Potenza e i soggetti beneficiari.

L'importo complessivo degli interventi finanziati è pari a 53,531 Meuro.

Nell'ambito nel Documento Strategico della città sono stati finanziati n. 8 interventi di riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, per un valore complessivo pari a 2,725 Meuro, tra cui l'efficientamento energetico degli Uffici in contrada Sant'Antonio La Macchia (per la cui attuazione è stato sottoscritto l'Accordo attuativo con la Provincia di Potenza), degli Uffici di Via N.Sauro, del Teatro "F. Stabile, del Palazzo di Città e del Palazzo del Consiglio. Inoltre, sono stati finanziati interventi di completamento e adeguamento energetico degli impianti sportivi Caizzo e Lepore, del complesso sportivo di Parco Montereale e dello Stadio Viviani, quest'ultimo in fase di ultimazione.

Al fine di aumentare la mobilità sostenibile nell'area urbana sono stati finanziati interventi, tra cui: l'Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città da via Cavour al centro storico e l'acquisto autobus per il Trasporto Pubblico Locale.

Attraverso l'intervento Infrastruttura verde, del valore complessivo pari a 2 Meuro s'intende migliorare le condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale.

Nell'ambito del turismo le operazioni volte al potenziamento del flusso turistico sono n. 6, per un valore complessivo di 6,96 Meuro e riguardano: la riqualificazione della Villa del Prefetto e Torre Guevara (nell'ambito dell'Accordo attuativo con la Provincia di Potenza), il Sistema integrato dei parchi storici del centro città (Parco di Montereale), il restauro conservativo del Ponte Musmeci; la ristrutturazione del Teatro Stabile, il Parco urbano di Villa Romana e il restauro e valorizzazione della Chiesa di San Michele Arcangelo (nell'ambito dell'Accordo attuativo con l'Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo). E' stato inoltre previsto un intervento di bonifica da amianto, in fase di definizione.

Nato con l'obiettivo di promuovere il diritto alla vita indipendente del disabile grave sostenendo, nel contempo, le sue capacità residue, il Progetto Casa famiglia "Dopo di noi" è in corso di attivazione. Il tema del disagio abitativo è stato affrontato su due versanti: con la costruzione di n. 5 fabbricati per complessivi n. 70 alloggi e n. 10 locali, in località Bucaletto per la cui attuazione è stato sottoscritto con il beneficiario ATER un Accordo e attraverso l'innovativo intervento di Housing first. Per il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici è stata selezionata la scuola materna e primaria a Rossellino. Inoltre, stati riservati ulteriori 800.000 euro a favore di 5 scuole della Città di Potenza e per i quali è stato sottoscritto un Accordo Attuativo tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.

A seguito delle esigenze manifestate dal Comune di Potenza nel corso degli incontri svoltisi nei primi mesi del 2020 e delle decisioni assunte nel corso del VI Comitato di Coordinamento e Monitoraggio svoltosi in data 30/10/2019 si sono resi necessarie le seguenti rimodulazioni: ammissione a finanziamento dell'operazione "Implementazione del sistema di raccolta porta a porta in aree prossime al centro abitato cittadino" (D.G.R.

n. 328 del 27 maggio 2020) e rimodulazione dell'intervento "Casa famiglia Dopo di noi". Ad ottobre 2020 si è provveduto a definire la rimodulazione di n. 8 interventi.
Spesa rendicontata dai beneficiari: 2,368 milioni di euro.

5.2.2 ITI Sviluppo Urbano Città di Matera

Nell'ambito della procedura negoziale dell'ITI Città di **Matera**, nel 2018 il Comune di Matera ha approvato il Documento Strategico e le relative schede dell'ITI. Con la D.G.R. n.208 del 15 marzo 2019 è stato approvato il Documento Strategico dell'ITI Città di Matera e l'ammissione a finanziamento delle 17 operazioni. L'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata ed il Comune è stato sottoscritto a marzo 2019. Una rimodulazione dell'ITI Matera è stata approvata ad agosto 2020 (D.G.R.n. 584 del 6 agosto 2020). L'importo complessivo degli interventi è pari a 40,265 Meuro.

In riferimento agli interventi di opere pubbliche, al fine di migliorare la fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione, sono stati finanziati gli interventi in corso di realizzazione afferenti la riqualificazione di Piazza della Visitazione e i lavori di realizzazione della nuova stazione di Matera Centrale che è stata inaugurata nel dicembre del 2019.

Inoltre sono stati finanziati gli interventi di ristrutturazione del Teatro Duni (4,490 Meuro), che risulta formalmente di proprietà del Comune di Matera dal mese di ottobre 2020 ed il restauro paesaggistico del Parco delle Cave (2 Meuro).

In ambito sociale, in tema di disagio abitativo è stata finanziata un'operazione per l'incremento dell'offerta di alloggi sociali a canone moderato (1,5 Meuro) e per il potenziamento dell'offerta di servizi sociosanitari territoriali sono state finanziate l'operazione per la realizzazione di una farmacia comunale nel borgo La Martella (0,3 Meuro) ed un centro di terapia per pazienti affetti da patologie cognitive (0.6 Meuro).

Relativamente agli interventi sulla mobilità per acquisti di beni e servizi sono ad oggi in fase di consegna i primi 4 autobus per il trasporto pubblico locale ed è stata finanziata un'operazione per l'acquisto di pannelli di infomobilità e app di supporto per completare il progetto di monitoraggio dei flussi pedonali e veicolari nella città e nei parcheggi pubblici.

Spesa rendicontata dai beneficiari: 7,756 milioni di euro.

6. STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI

Nel corso del 2019 la Regione Basilicata ha approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale ai sensi dell'articolo 96.3.d del Reg. UE n. 1303/2013 (Importo 3,13 Meuro – D.G.R. n. 793 del 6 novembre 2019 e D.G.R. n. 187 del 20 marzo 2020) che si propone di promuovere la creazione di partenariati interregionali e/o transnazionali per lo scambio di buone pratiche e il trasferimento di conoscenze. In particolare l'Avviso intende sostenere progetti che devono perseguire una delle seguenti finalità:

1. costituire nuove reti o rafforzare/valorizzare reti esistenti con partner europei per lo scambio di buone pratiche o il trasferimento di conoscenze, anche valorizzando e capitalizzando le esperienze della partecipazione a progetti finanziati con fondi UE (anche nell'ambito di programmi CTE) e/o favorire la partecipazione del sistema della ricerca regionale alle reti europee in materia di ricerca, innovazione tecnologica e digitalizzazione dell'economia (**progetti di Linea "A"**);
2. migliorare le strategie e le pianificazioni inerenti lo sviluppo locale e/o i servizi essenziali e/o sviluppare nuovi strumenti di *governance* nella gestione amministrativa su scala regionale e/o locale (**progetti di Linea "B"**).

A giugno 2020 sono pervenute 28 istanze sulla Linea A (da parte di Università e centri di Ricerca) e 51 sulla Linea B (da parte di Enti territoriali e locali ed Istituti scolastici). Ciascun progetto prevede il coinvolgimento di almeno un partner pubblico dell'Unione europea. La Commissione ha concluso l'attività di valutazione delle istanze candidate sulla Linea "A" e con atto del 9 novembre 2020 è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili e sono stati ammessi a finanziamento n. 7 progetti per un contributo pari a 1,94 Meuro.

Una sintesi dei 7 progetti selezionati è riportata nel seguente prospetto:

SOGGETTO CAPOFILA	ACRONIMO PROGETTO	BREVE DESCRIZIONE
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria - Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)	MEPLASUS	Studio di fattibilità per un modello territoriale di relazioni istituzionali, economiche e sociali al fine di rafforzare le microfiliere locali delle Pianta Officiali del Distretto Rurale Pollino-Lagonegrese, per rispondere ad una maggiore e qualificata richiesta da parte dei consumatori di prodotti con particolare riferimento alla presenza di componenti con proprietà nutrizionali e medicinali.
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS)	PAPRIKANET	Creazione di uno spazio comune di conoscenza (Paprikanet.it) per valorizzare specie autoctone Basilicata, casi studio su 3 prodotti lucani (peperone Senise, melanzana rossa e melanzana bianca) in agronomia, genetica, tossicologia, farmaceutica, chimica, e biologica
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS)	BEGIN	Sviluppare un protocollo metodologico-operativo multilivello, finalizzato alla valorizzazione, rigenerazione, gestione, fruizione e divulgazione dei paesi abbandonati (ghost-town), attraverso l'adozione, non esclusiva, di servizi ICT ad alta tecnologia

SOGGETTO CAPOFILA	ACRONIMO PROGETTO	BREVE DESCRIZIONE
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS)	AAA: SAFE SOS	Il Progetto mira alla ricerca di nuove molecole attive di origine naturale (peptidi antimicrobici) da due specie di insetti (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> e <i>Hermetia illucens</i>) al fine di sviluppare nuovi e numerosi farmaci eco compatibili ad attività antibiotica, antitumorale e antivirale.
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS)	URGES	Favorire il benessere di quartiere con sviluppo di infrastrutture verdi nell'edilizia residenziale pubblica (sito-pilota ATER Matera).
Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM)	MAGNET	Definizione di un innovativo modello sostenibile di conoscenza e fruizione dei musei e delle aree archeologiche del comprensorio lucano della Magna Grecia
Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS)	SKIPE	Studio pilota per la trasformazione, a basso costo, di prodotti ortofrutticoli, e per la riduzione degli sprechi post-raccolta

E' in corso la valutazione dei progetti candidati sulla Linea "B che si prevede di completare entro fine gennaio 2021.

L'avviso è stato considerato una "best practice" con riguardo all'attivazione della previsione dell'art. 96.3.d del Reg. UE n. 1303/2013 ed è stato oggetto di illustrazione durante la Settimana Europea delle Regioni e delle Città ad ottobre 2019 e ad ottobre 2020; nonché menzionata nella pubblicazione di novembre 2020 a cura del Programma Intercat "Report / Best practice related to the use of art. 96.3.d CPR – Basilicata Region (IT) 2014-2020"⁷.

Un estratto della stessa è stato inserito nelle "Guidelines on Cooperation in IGJ goal 2020+" predisposte dal Programma Intercat.

⁷ Cfr. https://www.interact-eu.net/library?title=&field_fields_of_expertise_tid=30&field_networks_tid=All#3196-report-best-practice-related-use-art-963d-cpr-%E2%80%93-basilicata-region-it-2014-2020

ALLEGATO 1

Principali indicatori di output al 5 dicembre 2020

**PO FESR BASILICATA 2014-2020
STATO DI AVANZAMENTO DEL PO,
PROSPETTIVE N+3 AL 31 DICEMBRE 2020
PREVISIONI DI SPESA PER IL 2021**

**Informativa - Punto 3) OdG del Comitato di Sorveglianza
del 15 dicembre 2020**

ASSE 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore 5.12.2020 Totale	Osservazioni
F	CO25	Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca	Equivalenti a tempo pieno	Meno sviluppate	28,00	0	
S	CO25	Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca	Equivalenti a tempo pieno	Meno sviluppate	28,00	9,50	
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	468,00	500,00	Le operazioni selezionate superano il valore target al 2023 e include le imprese che hanno ricevuto sostegno da T3Innovation
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	468,00	930,00	
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	339,00	500,00	
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	339,00	675,00	
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	129,00	0,00	
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Meno sviluppate	129,00	255,00	Le operazioni selezionate superano il valore target al 2023 e fa riferimento al numero di imprese che fanno parte dei Cluster finanziati
F	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	Meno sviluppate	132,00	0,00	
S	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	Meno sviluppate	132,00	255,00	
F	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	EUR	Meno sviluppate	5.480.000,00	0,00	
S	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	EUR	Meno sviluppate	5.480.000,00	0,00	

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore 5.12.2020 Totale	Osservazioni
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Meno sviluppate	339,00	500,00	
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Meno sviluppate	339,00	675,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

ASSE 2 - AGENDA DIGITALE

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore 5.12.2020 Totale	Osservazioni
F	SP03	Numero di edifici pubblici addizionali con accesso alla banda ultralarga di almeno 100 Mbps	Edifici pubblici	Meno sviluppate	330,00	293,00	
S	SP03	Numero di edifici pubblici addizionali con accesso alla banda ultralarga di almeno 100 Mbps	Edifici pubblici	Meno sviluppate	330,00	330,00	
F	SP04	Numero di aree industriali coperte da banda ultralarga ad almeno 100 Mbps	Aree industriali e produttive	Meno sviluppate	1,00	1,00	
S	SP04	Numero di aree industriali coperte da banda ultralarga ad almeno 100 Mbps	Aree industriali e produttive	Meno sviluppate	1,00	1,00	
F	Sp02b	Numero di unità immobiliari addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 mbps	Unità immobiliari	Meno sviluppate	140.439,00	105.946,00	
S	Sp02b	Numero di unità immobiliari addizionali con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 mbps	Unità immobiliari	Meno sviluppate	140.439,00	105.946,00	
F	SP07	Numero di persone con Fascicolo Sanitario Elettronico attivato	Persone	Meno sviluppate	400.000,00	5.000,00	
S	SP07	Numero di persone con Fascicolo Sanitario Elettronico attivato	Persone	Meno sviluppate	400.000,00	400.000,00	
F	SP08b	Numero di apparati e sistemi informativi realizzati	apparati	Meno sviluppate	128,00	1,00	
S	SP08b	Numero di apparati e sistemi informativi realizzati	apparati	Meno sviluppate	128,00	129,00	si riscontra un superamento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era legata ad una stima degli apparati wi-fi che si intendeva erogare ai Comuni e alle aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regionali. Le operazioni ammesse consentono di erogare più apparati wi-fi.
F	SP09	Numero di identità digitali addizionali assegnate	Id digitali	Meno sviluppate	50.000,00	6.000,00	
S	SP09	Numero di identità digitali addizionali assegnate	Id digitali	Meno sviluppate	50.000,00	50.000,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

ASSE 3 – COMPETITIVITÀ

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	di Categoria di regioni	di Valore obiettivo (2023) totale	Valore 5.12.2020 Totale	Osservazioni
F	CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	25147	16534	
S	CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	25147	17029	
F	CO05	Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	446	109	
S	CO05	Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Meno sviluppate	446	406	
F	CO08	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti a tempo pieno	Meno sviluppate	267	66	
S	CO08	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti a tempo pieno	Meno sviluppate	267	244	
F	CV22	Numero di PMI sostenute con sostegno finanziario non rimborsabile per il capitale circolante (sovvenzioni) nella risposta COVID-19	Imprese	Meno sviluppate	17376	15027	
S	CV22	Numero di PMI sostenute con sostegno finanziario non rimborsabile per il capitale circolante (sovvenzioni) nella risposta COVID-19	Imprese	Meno sviluppate	17376	15027	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

ASSE 4 - ENERGIA E MOBILITÀ URBANA

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore 5.12.2020 Totale	Osservazioni
F	CO31	Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici	Nuclei familiari	Meno sviluppate	120,00	0,00	
S	CO31	Efficienza energetica: Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici	Nuclei familiari	Meno sviluppate	120,00	216,00	Le operazioni selezionate superano il valore target al 2023 in quanto interessano edifici che presentano più nuclei familiari di quelli calcolati nella relativa nota metodologica.
F	SP15	Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata	Edifici pubblici	Meno sviluppate	36,00	2,00	
S	SP15	Numero di edifici pubblici con classificazione del consumo energetico migliorata	Edifici pubblici	Meno sviluppate	36,00	39,00	Si riscontra un superamento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era legata ad una stima degli interventi da realizzare sugli edifici pubblici e del costo medio di realizzazione di interventi analoghi finanziati sul ciclo di programmazione 2007-2013. Dalle operazioni ammesse a finanziamento si evince che il costo medio degli interventi è risultato inferiore rispetto a quanto stimato in fase di programmazione.
F	SP16	N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica	Numero	Meno sviluppate	5,00	1,00	
S	SP16	N.ro interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica	Numero	Meno sviluppate	5,00	8,00	Si riscontra un superamento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era legata ad una stima degli interventi di miglioramento della rete di illuminazione pubblica da realizzare e del costo medio di realizzazione di interventi analoghi finanziati sul ciclo di programmazione 2007-2013. Dalle operazioni ammesse a finanziamento si evince che il costo medio degli interventi è risultato inferiore rispetto a quanto stimato in fase di programmazione.
F	SP17	Km di rete realizzati	Km	Meno sviluppate	914,00	0,00	
S	SP17	Km di rete realizzati	Km	Meno sviluppate	914,00	917,65	Le operazioni ammesse a finanziamento comportano un superamento del target al 2023

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore 5.12.2020 Totale	Osservazioni
F	SP22	Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento	Impianti	Meno sviluppate	1,00	0,00	
S	SP22	Numero di impianti di cogenerazione e trigenerazione oggetto di intervento	Impianti	Meno sviluppate	1,00	1,00	
F	SP20	Autobus acquistati	Numero	Meno sviluppate	27	7	
S	SP20	Autobus acquistati	Numero	Meno sviluppate	27	27	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

ASSE 5 - TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023) totale	Valore 5/12/2020 Totale	Osservazioni
F	CO17	Rifiuti solidi: Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti	Tonnellate/anno	80.000,00	0,00	
S	CO17	Rifiuti solidi: Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti	Tonnellate/anno	80.000,00	85.000,00	
F	SP23	Numero di centri di raccolta realizzati	centri di raccolta	40,00	0,00	
S	SP23	Numero di centri di raccolta realizzati	centri di raccolta	40,00	65,00	Nel valorizzare l'indicatore per RAA 2019 si riportano un numero centri di raccolta (sp23) pari a 45. Nel 2020 sono stati ammessi a finanziamento i 20 centri di raccolta relativi al secondo avviso. Il numero di centri di raccolta finanziato è destinato ad aumentare con l'approvazione delle graduatorie del terzo Avviso.
F	SP24	Numero di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti realizzati	impianti	3,00	0,00	
S	SP24	Numero di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti realizzati	impianti	3,00	7,00	Nel 2019 si è conclusa la procedura negoziata con gli Enti pubblici del settore e con D.G.R.n. 406 del 28/06/2019 sono stati ammessi a finanziamento sul PO FESR le operazioni selezionate.
F	CO18	Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico	Persone	125.000,00	0,00	
S	CO18	Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico	Persone	125.000,00	131.704,00	Nel 2019 si è concluso l'iter di selezione delle operazioni e sono state ammesse a finanziamento sul PO FESR le operazioni selezionate (D.G.R. n. 522 del 31 luglio 2019).
F	CO19	Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue	Popolazione equivalente	113.000,00	0,00	
S	CO19	Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue	Popolazione equivalente	113.000,00	154.337,00	La porzione aggiuntiva di popolazione equivalente servita è aumentata a seguito dell'adozione D.G.R.n. 233/2020 che ha ammesso a finanziamento altre 12 operazioni.

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	di	Valore obiettivo (2023) totale	Valore 5/12/2020 Totale	Osservazioni
F	SP25	Numero di reti idriche realizzate	reti		5,00	0,00	
S	SP25	Numero di reti idriche realizzate	reti		5,00	3,00	
F	SP26	Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso	interventi		3,00	0,00	
S	SP26	Numero di interventi di miglioramento e ripristino delle capacità di invaso	interventi		3,00	5,00	A valere su fondi nazionali (FSC) nella medesima procedura negoziata sono stati ammessi a finanziamento altri 13 interventi per complessivi 23 Meuro.
F	SP29	Impianti di depurazione delle acque reflue urbane per tipologia di trattamento Secondario e Terziario	Impianti		22,00	0,00	
S	SP29	Impianti di depurazione delle acque reflue urbane per tipologia di trattamento Secondario e Terziario	Impianti		22,00	38	Il numero di depuratori è aumentato a seguito dell'adozione D.G.R.n. 233/2020 che ha ammesso a finanziamento altre 12 operazioni.
F	SP31	Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati	Numero		15,00	12,00	
S	SP31	Numero di interventi sul patrimonio culturale realizzati	Numero		15,00	49,00	si riscontra un superamento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era legata ad una stima degli interventi da realizzare sul patrimonio culturale e del costo medio di realizzazione di interventi analoghi finanziati sul ciclo di programmazione 2007-2013. Dalle operazioni ammesse a finanziamento si evince che il costo medio degli interventi è risultato inferiore rispetto a quanto stimato in fase di programmazione.
F	SP33	Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati	Numero		3,00	2,00	
S	SP33	Numero di progetti integrati ambientali, culturali e turistici realizzati	Numero		3,00	17,00	si riscontra un superamento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era legata ad una stima dei progetti integrati ambientali, culturali e turistici da realizzare ed al costo medio di realizzazione di interventi analoghi finanziati sul ciclo di programmazione 2007-2013. Dalle operazioni ammesse a finanziamento si evince che il costo medio degli interventi è risultato inferiore rispetto a quanto stimato in fase di programmazione.
F	SP52	Azioni di comunicazione realizzate	numero		5,00	3,00	

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	di	Valore obiettivo (2023) totale	Valore 5/12/2020 Totale	Osservazioni
S	SP52	Azioni di comunicazione realizzate	numero		5,00	3,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

ASSE 6 - SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023) totale	Valore 5/12/2020 Totale	Osservazioni
F	CO14	Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate	Km	87	80,08	
S	CO14	Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate	Km	87	180	
F	SP36	Numero di interventi ferroviari realizzati	unità	4	1	
S	SP36	Numero di interventi ferroviari realizzati	unità	4	4	
F	CO12	Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o ristrutturate	Km	2	1	
S	CO12	Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o ristrutturate	Km	2	2	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

ASSE 7 - INCLUSIONE SOCIALE

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo (2023) totale	Valore 5.12.2020 Totale	Osservazioni
F	SP37	Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili	persone	330,00	0,00	
S	SP37	Capacità infrastruttura per assistenza ad anziani e disabili	persone	330,00	330,00	Si riscontra un superamento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era legata ad una stima degli interventi destinati ad infrastrutture pubbliche sulla base del costo medio di realizzazione di interventi analoghi finanziati sul ciclo di programmazione 2007-2013. Dalle operazioni ammesse a finanziamento si evince che il costo medio degli interventi è risultato inferiore rispetto a quanto stimato in fase di programmazione.
F	SP53	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori	persone	200,00	0,00	
S	SP53	Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza ai minori	persone	200,00	200,00	
F	CO36	Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati	Persone	50.300,00	0,00	
S	CO36	Sanità: Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati	Persone	50.300,00	50.300,00	
F	SP38	Superfici oggetto di intervento	mq	5.187,50	0,00	
S	SP38	Superfici oggetto di intervento	mq	5.187,50	5.187,50	
F	SP39	Abitazioni ripristinate in zone urbane	Alloggi	83,00	0,00	
S	SP39	Abitazioni ripristinate in zone urbane	Alloggi	83,00	83,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

ASSE 8 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo (2023) totale	Valore 5.12.2020 Totale	Osservazioni
F	SP40	Superficie oggetto di intervento	mq	42.707,00	500,00	
S	SP40	Superficie oggetto di intervento	mq	42.707,00	42.707,00	
F	SP42	Numero plessi scolastici oggetto di intervento	numero	108,00	0,00	
S	SP42	Numero plessi scolastici oggetto di intervento	numero	108,00	47,00	
F	SP43	Numero di interventi per il potenziamento di laboratori di settore	numero	16,00	0,00	
S	SP43	Numero di interventi per il potenziamento di laboratori di settore	numero	16,00	16,00	
F	SP44	Numero di interventi per il potenziamento della connettività e della dotazione ICT	numero	60,00	4,00	
S	SP44	Numero di interventi per il potenziamento della connettività e della dotazione ICT	numero	60,00	108,00	si riscontra un superamento del target al 2023 in quanto la stima dello stesso era legata ad una stima degli interventi per il potenziamento della connettività e della dotazione ICT da realizzare ed al costo medio di realizzazione di interventi analoghi finanziati sul ciclo di programmazione 2007-2013. Dalle operazioni ammesse a finanziamento si evince che il costo medio degli interventi è risultato inferiore rispetto a quanto stimato in fase di programmazione.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
